
ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

Open Planner Studio

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
1	**Obras y adecuaciones**	6680h	18-05-2026	27-07-2029
1.1	**Diseños de las obras aprobados**	1016h	18-05-2026	10-11-2026
1.1.1	**Diseños de la terminal revisados y aprobados**	768h	18-05-2026	28-09-2026
1.1.1-01	Revisar técnicamente el expediente de diseño...	31d	18-05-2026	29-06-2026
1.1.1-02	Ajustar los diseños y el presupuesto de la ter...	32d	30-06-2026	12-08-2026
1.1.1-03	Revisar la coordinación del modelo BIM de la t...	16d	22-07-2026	12-08-2026
1.1.1-04	Aprobar el expediente de diseño de la terminal	11d	04-09-2026	18-09-2026
1.1.1-05	Emitir la no objeción del BID a las especificaci...	6d	21-09-2026	28-09-2026
1.1.2	**Diseños de plataformas y calle Foxtrot revisado...**	1016h	18-05-2026	10-11-2026
1.1.2-01	Realizar sondeos geotécnicos en las tres posi...	32d	18-05-2026	30-06-2026
1.1.2-02	Revisar técnicamente los diseños de platafor...	31d	30-06-2026	11-08-2026
1.1.2-03	Revisar con la AAC la geometría del lado aire ...	22d	12-08-2026	10-09-2026
1.1.2-04	Ajustar los diseños y el presupuesto de plataf...	26d	11-09-2026	16-10-2026
1.1.2-05	Aprobar los diseños de plataformas y calle Fo...	11d	19-10-2026	02-11-2026
1.1.2-06	Emitir la no objeción del BID a las especificaci...	6d	03-11-2026	10-11-2026
1.1.3	**Diseños del estacionamiento y del sistema sola...**	568h	18-05-2026	24-08-2026
1.1.3-01	Revisar técnicamente el expediente de diseño...	32d	18-05-2026	30-06-2026
1.1.3-02	Revisar el diseño del sistema fotovoltaico y su...	13d	01-06-2026	17-06-2026
1.1.3-03	Ajustar los diseños y el presupuesto del estaci...	22d	01-07-2026	30-07-2026
1.1.3-04	Aprobar el expediente de diseño del estaciona...	11d	31-07-2026	14-08-2026
1.1.3-05	Emitir la no objeción del BID a las especificaci...	6d	17-08-2026	24-08-2026
1.1.4	**Diseños del SSEI revisados y aprobados**	560h	01-07-2026	06-10-2026
1.1.4-01	Revisar técnicamente el diseño del edificio del...	21d	01-07-2026	29-07-2026
1.1.4-02	Validar con el SSEI y la AAC el emplazamiento...	16d	30-07-2026	20-08-2026
1.1.4-03	Ajustar el diseño del SSEI con la firma diseñad...	16d	21-08-2026	11-09-2026
1.1.4-04	Aprobar el diseño del SSEI	11d	14-09-2026	28-09-2026
1.1.4-05	Emitir la no objeción del BID a las especificaci...	6d	29-09-2026	06-10-2026
1.2	**Terminal de pasajeros ampliada**	5416h	13-08-2026	16-03-2029
1.2.1	**Estructura y envolvente de la terminal construi...**	2224h	27-05-2027	19-06-2028
1.2.1-01	Movilizar al contratista e instalar cerramientos,...	31d	27-05-2027	08-07-2027
1.2.1-02	Ejecutar la demolición, el movimiento de tierra...	78d	09-07-2027	26-10-2027
1.2.1-03	Construir la estructura de concreto de los nive...	133d	03-09-2027	07-03-2028
1.2.1-04	Montar la estructura metálica y la cubierta de l...	77d	14-01-2028	01-05-2028
1.2.1-05	Instalar las fachadas de vidrio y los cerrament...	82d	25-02-2028	19-06-2028
1.2.2	**Salas de espera, circulación y áreas de apoyo t...**	1296h	10-03-2028	23-10-2028
1.2.2-01	Construir las divisiones, la mampostería livian...	96d	10-03-2028	21-07-2028

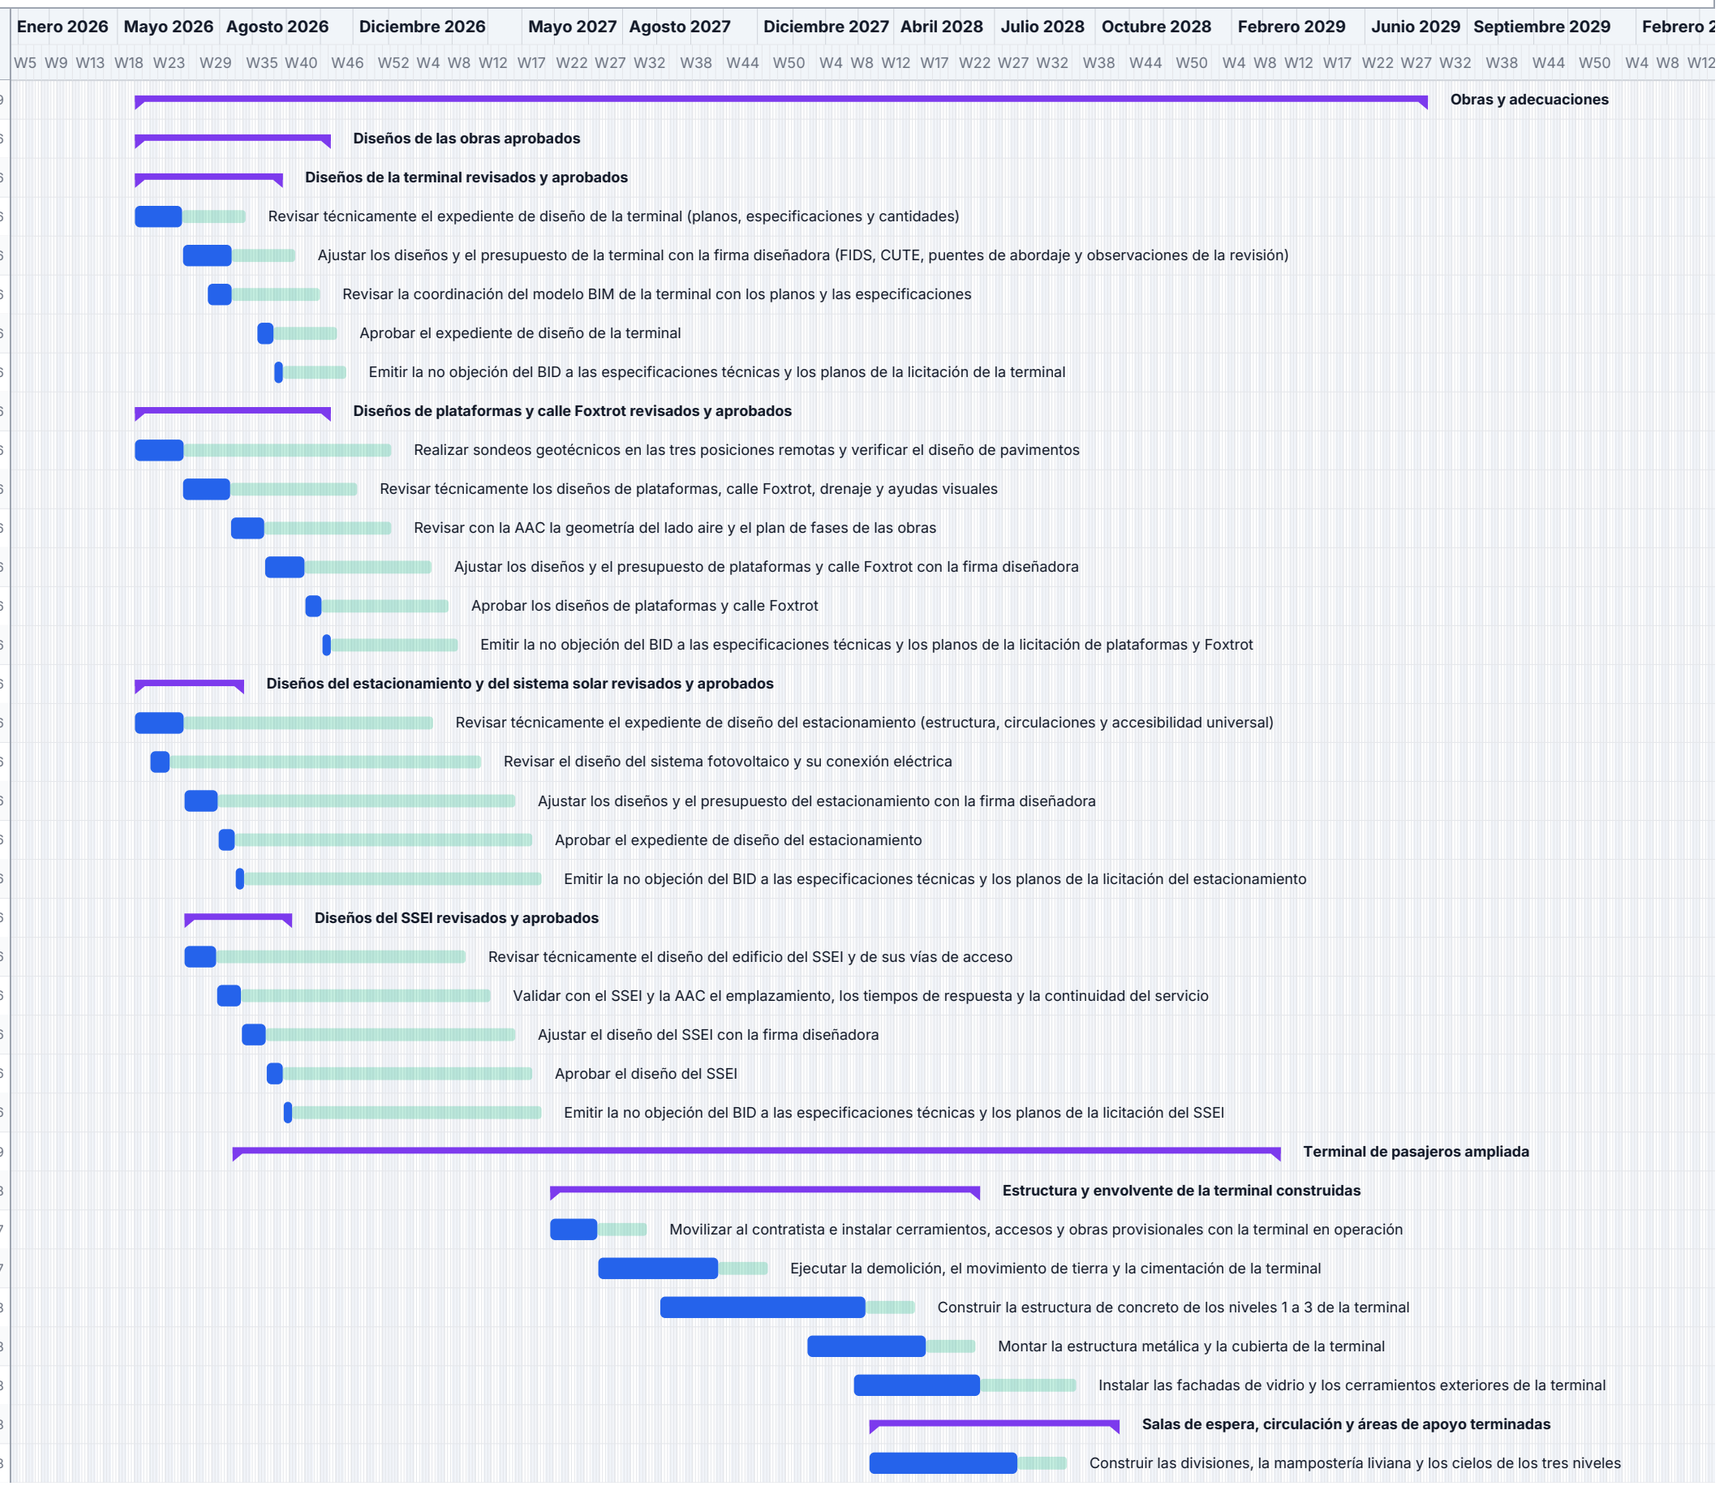


ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
1.2.2-02	Aplicar los acabados de pisos y paredes de la...	107d	19-05-2028	16-10-2028
1.2.2-03	Integrar la ampliación con la terminal de la Eta...	46d	21-08-2028	23-10-2028
1.2.3	**Instalaciones eléctricas, hidráulicas, climatizac...**	1536h	25-02-2028	20-11-2028
1.2.3-01	Instalar las redes eléctricas, de agua, de dren...	116d	25-02-2028	04-08-2028
1.2.3-02	Instalar la subestación, los tableros, la planta ...	78d	02-05-2028	17-08-2028
1.2.3-03	Instalar la detección y supresión de incendios,...	72d	11-05-2028	18-08-2028
1.2.3-04	Realizar las pruebas, el balanceo y la puesta e...	52d	08-09-2028	20-11-2028
1.2.4	**Puentes de abordaje, mobiliario y equipos insta...**	3288h	20-08-2027	16-03-2029
1.2.4-01	Elaborar y aprobar los planos de taller de los s...	42d	20-08-2027	18-10-2027
1.2.4-02	Fabricar y entregar en sitio los seis puentes d...	132d	19-10-2027	19-04-2028
1.2.4-03	Instalar y conectar los seis puentes de abordaj...	52d	24-10-2028	03-01-2029
1.2.4-04	Instalar el mobiliario, los escáneres de segurid...	37d	29-09-2028	20-11-2028
1.2.4-05	Probar los equipos, capacitar al personal de C...	31d	04-01-2029	15-02-2029
1.2.4-06	Realizar las pruebas integradas de operación ...	21d	16-02-2029	16-03-2029
1.2.5	**Accesibilidad universal, movilidad del cuidado ...**	4784h	13-08-2026	27-11-2028
1.2.5-01	Verificar en los planos aprobados los recorrid...	16d	13-08-2026	03-09-2026
1.2.5-02	Verificar en el diseño aprobado las metas EDG...	16d	13-08-2026	03-09-2026
1.2.5-03	Verificar en obra la ejecución de los recorrido...	21d	02-10-2028	30-10-2028
1.2.5-04	Verificar en obra las medidas de eficiencia y r...	19d	01-11-2028	27-11-2028
1.3	**Plataformas de contacto y remotas**	3000h	11-08-2027	16-01-2029
1.3.1	**Plataforma de posiciones de contacto construida**	2552h	11-08-2027	30-10-2028
1.3.1-01	Movilizar al contratista de plataformas y Foxtr...	31d	11-08-2027	22-09-2027
1.3.1-02	Construir la terracería, el drenaje y la base de l...	52d	23-09-2027	03-12-2027
1.3.1-03	Colar el pavimento de concreto de la fase 1 de...	87d	06-12-2027	04-04-2028
1.3.1-04	Construir la terracería, el drenaje y la base de l...	52d	12-04-2028	22-06-2028
1.3.1-05	Colar el pavimento de concreto de la fase 2 d...	87d	23-06-2028	23-10-2028
1.3.1-06	Instalar los ductos y los servicios de apoyo a a...	26d	25-09-2028	30-10-2028
1.3.2	**Plataforma de posiciones remotas construida**	1080h	16-02-2028	22-08-2028
1.3.2-01	Demoler el SSEI antiguo y despejar la huella d...	21d	16-02-2028	15-03-2028
1.3.2-02	Ejecutar la terracería y la capa de suelo ceme...	42d	16-03-2028	12-05-2028
1.3.2-03	Modificar los canales existentes y construir el ...	31d	13-04-2028	25-05-2028
1.3.2-04	Colar el pavimento de concreto de 34 cm de l...	58d	26-05-2028	15-08-2028
1.3.2-05	Construir el pavimento asfáltico de los márgen...	26d	18-07-2028	22-08-2028
1.3.3	**Señalización, luces y torres de iluminación de p...**	1088h	11-07-2028	16-01-2029
1.3.3-01	Instalar los ductos, las torres de iluminación y ...	41d	25-09-2028	20-11-2028
1.3.3-02	Instalar las luces de borde y las torres de ilumi...	36d	11-07-2028	29-08-2028

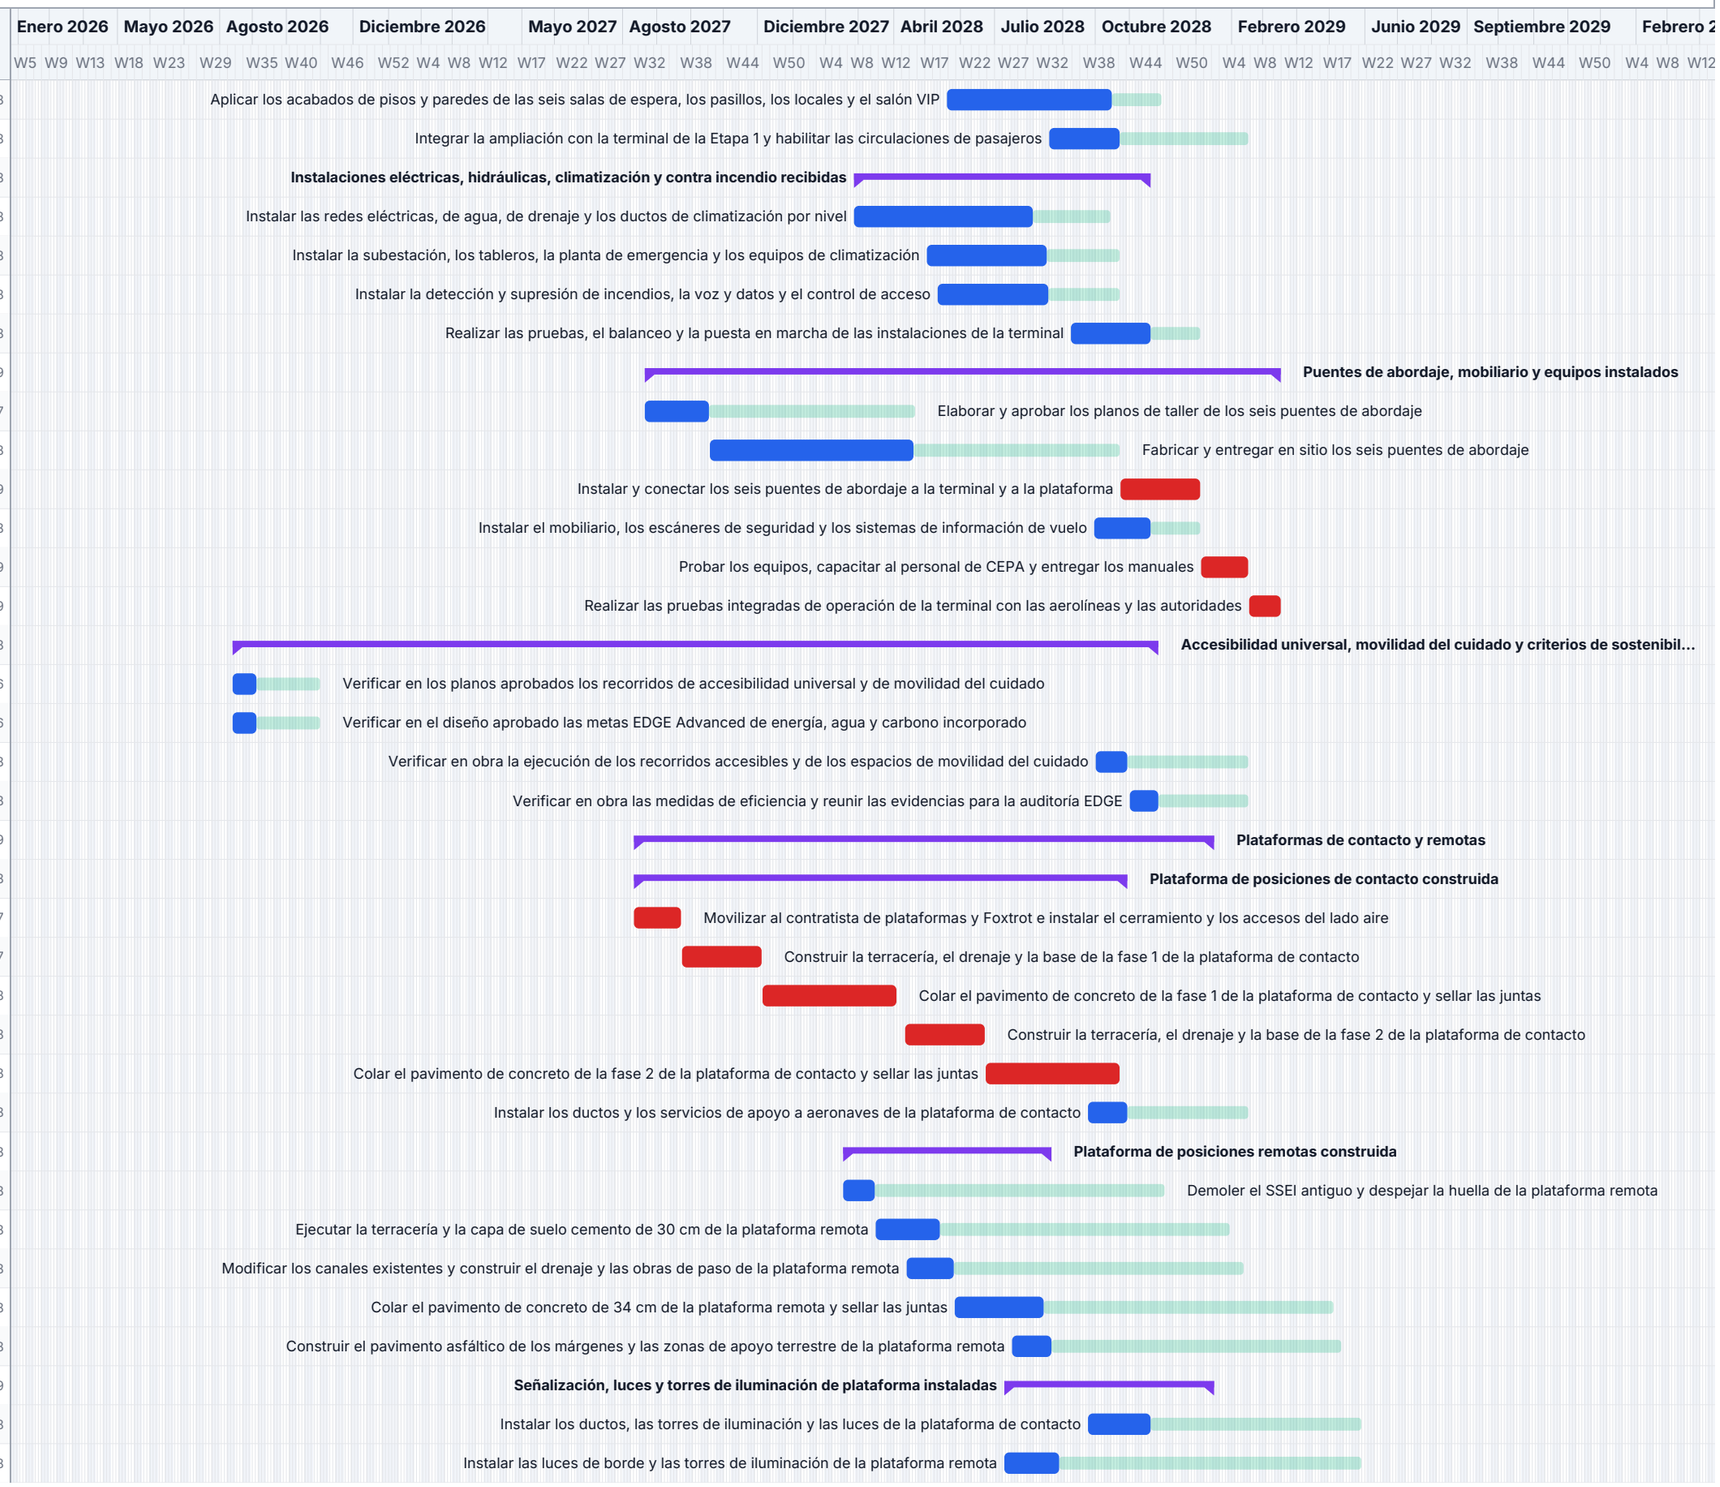


ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
1.3.3-03	Pintar la señalización horizontal de las plataf...	13d	28-11-2028	14-12-2028
1.3.3-04	Probar las luces y la señalización de las plataf...	11d	15-12-2028	29-12-2028
1.3.3-05	Autorizar la puesta en servicio de las plataf...	12d	01-01-2029	16-01-2029
1.4	**Calle de rodaje Foxtrot**	1264h	05-04-2028	10-11-2028
1.4.1	**Pavimento y hombros de la calle Foxtrot constr...**	832h	05-04-2028	28-08-2028
1.4.1-01	Ejecutar la terracería, la base granular y el dre...	52d	05-04-2028	15-06-2028
1.4.1-02	Pavimentar con concreto asfáltico la calle Fox...	31d	16-06-2028	28-07-2028
1.4.1-03	Construir la intersección de Foxtrot con la call...	32d	14-07-2028	28-08-2028
1.4.2	**Señalización y balizamiento de la calle Foxtrot i...**	432h	29-08-2028	10-11-2028
1.4.2-01	Instalar los ductos, el cableado y las luces de ...	31d	29-08-2028	10-10-2028
1.4.2-02	Pintar la señalización horizontal de la calle Fox...	10d	29-08-2028	11-09-2028
1.4.2-03	Probar el balizamiento y la iluminación de la c...	11d	11-10-2028	25-10-2028
1.4.2-04	Autorizar la puesta en servicio de la calle Foxt...	12d	26-10-2028	10-11-2028
1.5	**Estacionamiento y energía solar**	2696h	16-02-2027	31-05-2028
1.5.1	**Edificio de estacionamiento construido**	2368h	16-02-2027	04-04-2028
1.5.1-01	Movilizar al contratista e instalar los cerramien...	31d	16-02-2027	30-03-2027
1.5.1-02	Construir la cimentación del edificio de estaci...	72d	31-03-2027	08-07-2027
1.5.1-03	Construir la estructura de los niveles 1 y 2 del ...	127d	12-05-2027	04-11-2027
1.5.1-04	Construir la estructura del nivel superior, la cu...	68d	08-09-2027	10-12-2027
1.5.1-05	Instalar las redes eléctricas, de iluminación, d...	111d	30-07-2027	31-12-2027
1.5.1-06	Construir los acabados, los ascensores, las ru...	105d	10-11-2027	04-04-2028
1.5.2	**Sistemas de acceso, tráfico y áreas de alquiler i...**	616h	24-11-2027	09-03-2028
1.5.2-01	Instalar el control de acceso, las barreras, el c...	52d	01-12-2027	10-02-2028
1.5.2-02	Habilitar las áreas de alquiler de vehículos y la...	41d	24-11-2027	19-01-2028
1.5.2-03	Probar los sistemas de acceso y tráfico y cap...	20d	11-02-2028	09-03-2028
1.5.3	**Sistema de generación solar instalado**	2216h	11-05-2027	31-05-2028
1.5.3-01	Tramitar la autorización de interconexión del s...	38d	11-05-2027	01-07-2027
1.5.3-02	Instalar las estructuras de soporte y los panel...	46d	08-02-2028	11-04-2028
1.5.3-03	Instalar los inversores, el cableado, los tablero...	31d	14-03-2028	25-04-2028
1.5.3-04	Probar y energizar el sistema solar y entregar ...	26d	26-04-2028	31-05-2028
1.6	**SSEI reubicado y en operación**	1384h	18-06-2027	15-02-2028
1.6.1	**Edificio del SSEI y vías de acceso construidos**	1096h	18-06-2027	27-12-2027
1.6.1-01	Movilizar al contratista e instalar los cerramien...	20d	18-06-2027	15-07-2027
1.6.1-02	Construir la cimentación y la estructura del edi...	51d	16-07-2027	24-09-2027
1.6.1-03	Construir la cubierta, los cerramientos y las in...	56d	27-08-2027	12-11-2027
1.6.1-04	Construir las vías de acceso y de salida a la pl...	41d	13-08-2027	08-10-2027

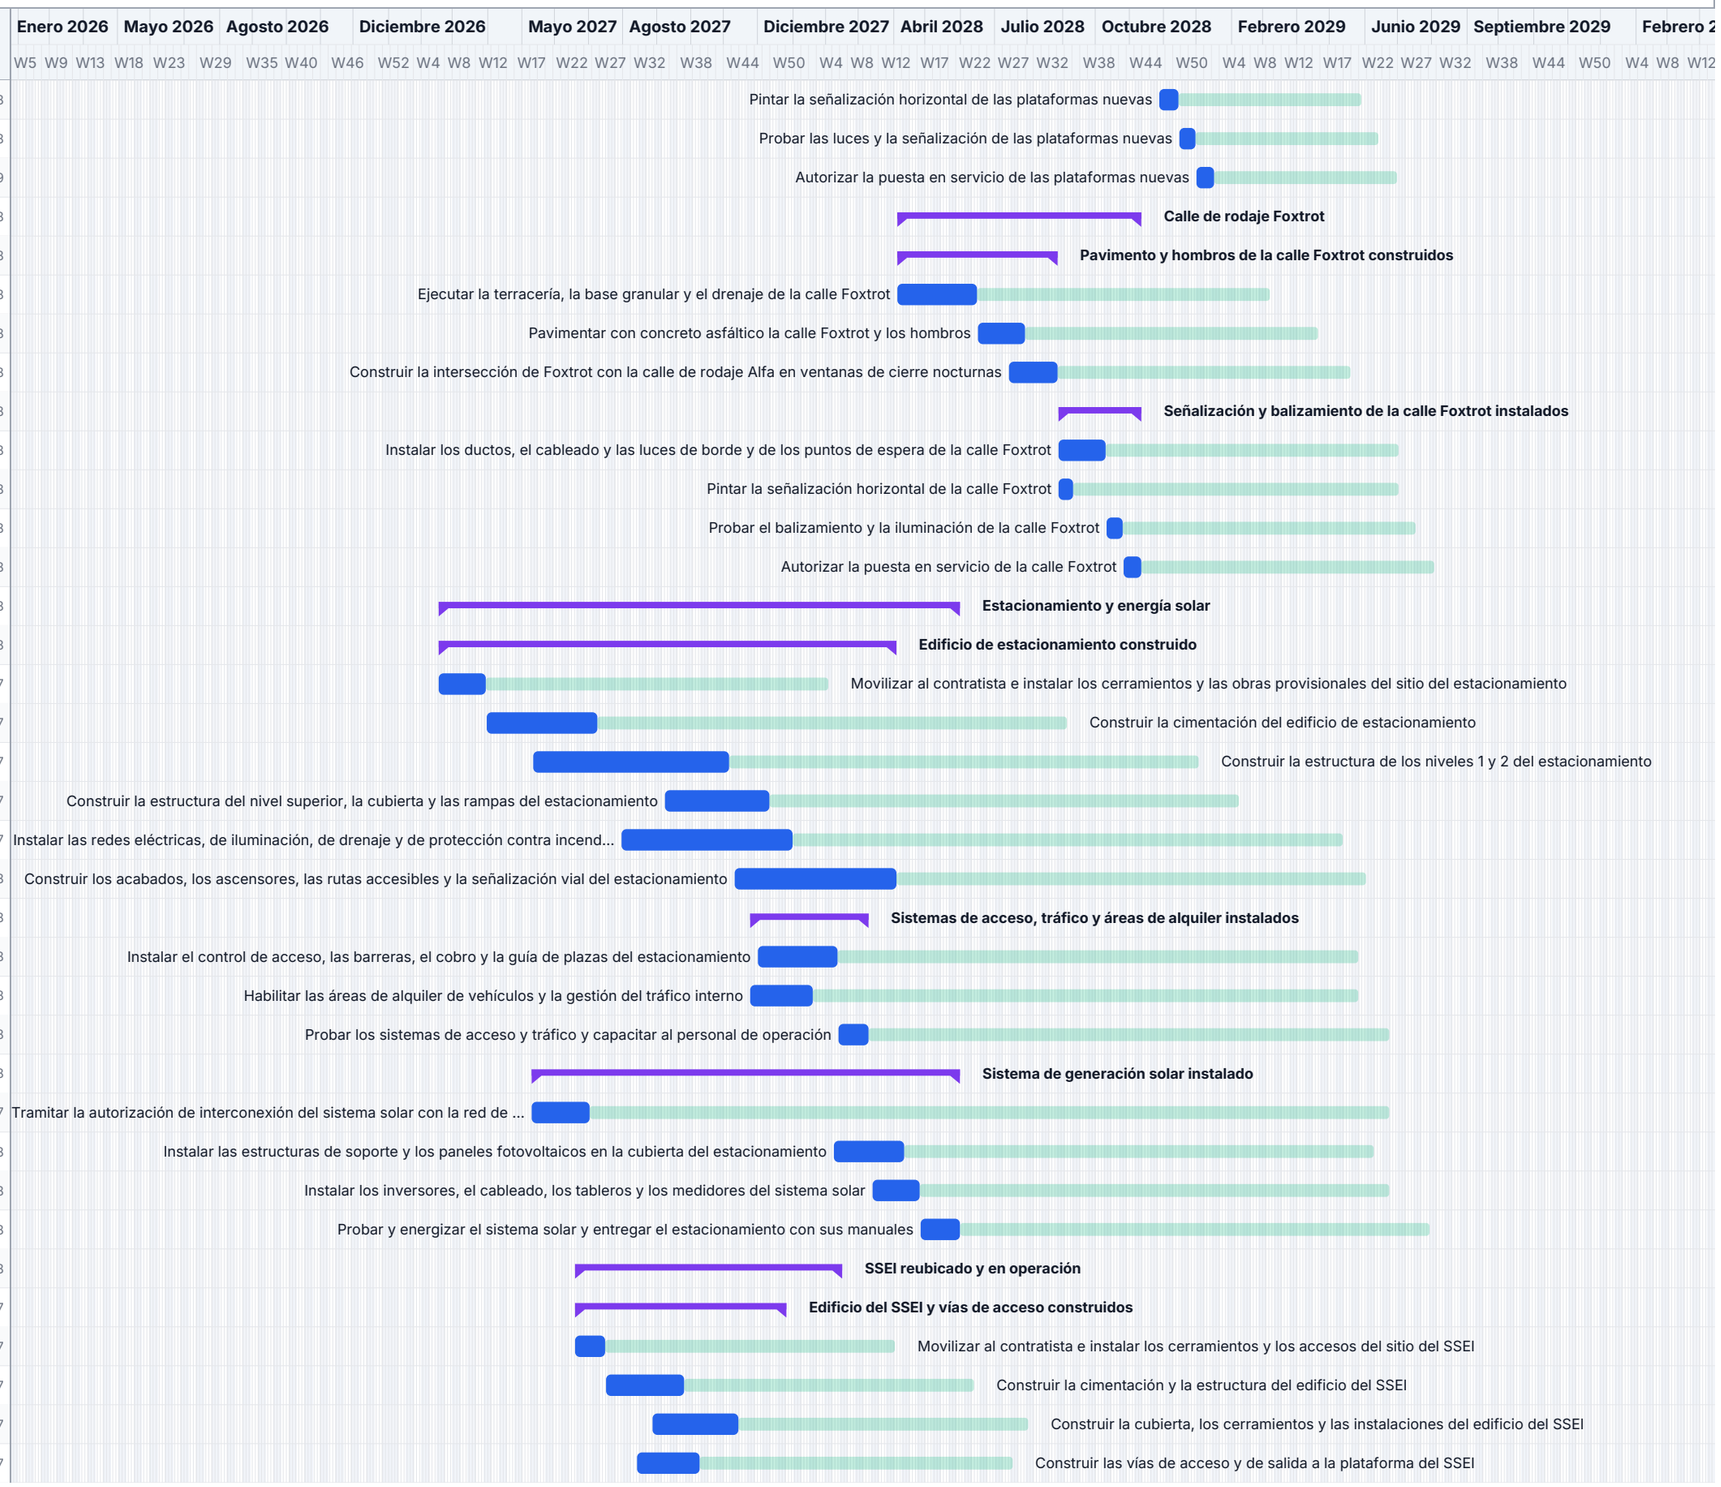


ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

Open Planner Studio

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
1.6.1-05	Instalar los acabados, los sistemas de alarma ...	41d	01-11-2027	27-12-2027
1.6.2	**SSEI en funcionamiento en la nueva ubicación**	984h	27-08-2027	15-02-2028
1.6.2-01	Preparar el plan de traslado y de cobertura del...	21d	27-08-2027	24-09-2027
1.6.2-02	Dar la conformidad a la cobertura de protecci...	11d	27-09-2027	11-10-2027
1.6.2-03	Equipar el edificio nuevo y trasladar al person...	16d	10-01-2028	31-01-2028
1.6.2-04	Realizar las pruebas de tiempo de respuesta y...	11d	01-02-2028	15-02-2028
1.7	**Supervisión, PGAS de obra y recepción**	5216h	28-01-2027	27-07-2029
1.7.1	**Supervisión de la terminal y del estacionamient...**	5176h	04-02-2027	27-07-2029
1.7.1-01	Movilizar a la firma de supervisión de la terminal	11d	20-05-2027	03-06-2027
1.7.1-02	Supervisar la construcción de la terminal	487d	04-06-2027	16-04-2029
1.7.1-03	Movilizar a la firma de supervisión del estacio...	11d	04-02-2027	18-02-2027
1.7.1-04	Supervisar la construcción del estacionamient...	347d	19-02-2027	19-06-2028
1.7.1-05	Presentar el informe final de supervisión de la ...	16d	06-07-2029	27-07-2029
1.7.1-06	Presentar el informe final de supervisión del e...	16d	17-08-2028	07-09-2028
1.7.2	**Supervisión de plataformas, calle Foxtrot y SSE...**	3912h	11-06-2027	25-04-2029
1.7.2-01	Movilizar a la firma de supervisión de platafor...	11d	29-07-2027	12-08-2027
1.7.2-02	Supervisar la construcción de plataformas y d...	386d	13-08-2027	02-02-2029
1.7.2-03	Movilizar a la firma de supervisión del SSEI	9d	11-06-2027	23-06-2027
1.7.2-04	Supervisar la construcción del edificio del SSEI	142d	24-06-2027	07-01-2028
1.7.2-05	Presentar el informe final de supervisión de pl...	16d	04-04-2029	25-04-2029
1.7.2-06	Presentar el informe final de supervisión del S...	13d	22-02-2028	09-03-2028
1.7.3	**PGAS de construcción implementado**	4752h	28-01-2027	08-05-2029
1.7.3-01	Revisar y aprobar el PGAS de construcción de...	13d	28-01-2027	15-02-2027
1.7.3-02	Revisar y aprobar el PGAS de construcción de...	16d	26-04-2027	17-05-2027
1.7.3-03	Revisar y aprobar el PGAS de construcción de...	9d	28-05-2027	09-06-2027
1.7.3-04	Revisar y aprobar el PGAS de construcción de...	13d	23-07-2027	10-08-2027
1.7.3-05	Dar seguimiento al cumplimiento del PGAS dur...	565d	16-02-2027	16-04-2029
1.7.3-06	Verificar el cierre de las instalaciones tempora...	16d	17-04-2029	08-05-2029
1.7.4	**Planos de obra ejecutada y actas de recepción ...**	3184h	28-12-2027	05-07-2029
1.7.4-01	Realizar la recepción provisional de la terminal...	21d	19-03-2029	16-04-2029
1.7.4-02	Realizar la recepción provisional del estaciona...	13d	01-06-2028	19-06-2028
1.7.4-03	Realizar la recepción provisional de las platafo...	13d	17-01-2029	02-02-2029
1.7.4-04	Realizar la recepción provisional del edificio d...	9d	28-12-2027	07-01-2028
1.7.4-05	Verificar la subsanación de pendientes, recibir...	58d	17-04-2029	05-07-2029
1.7.4-06	Verificar la subsanación de pendientes, recibir...	42d	20-06-2028	16-08-2028
1.7.4-07	Verificar la subsanación de pendientes, recibir...	42d	05-02-2029	03-04-2029

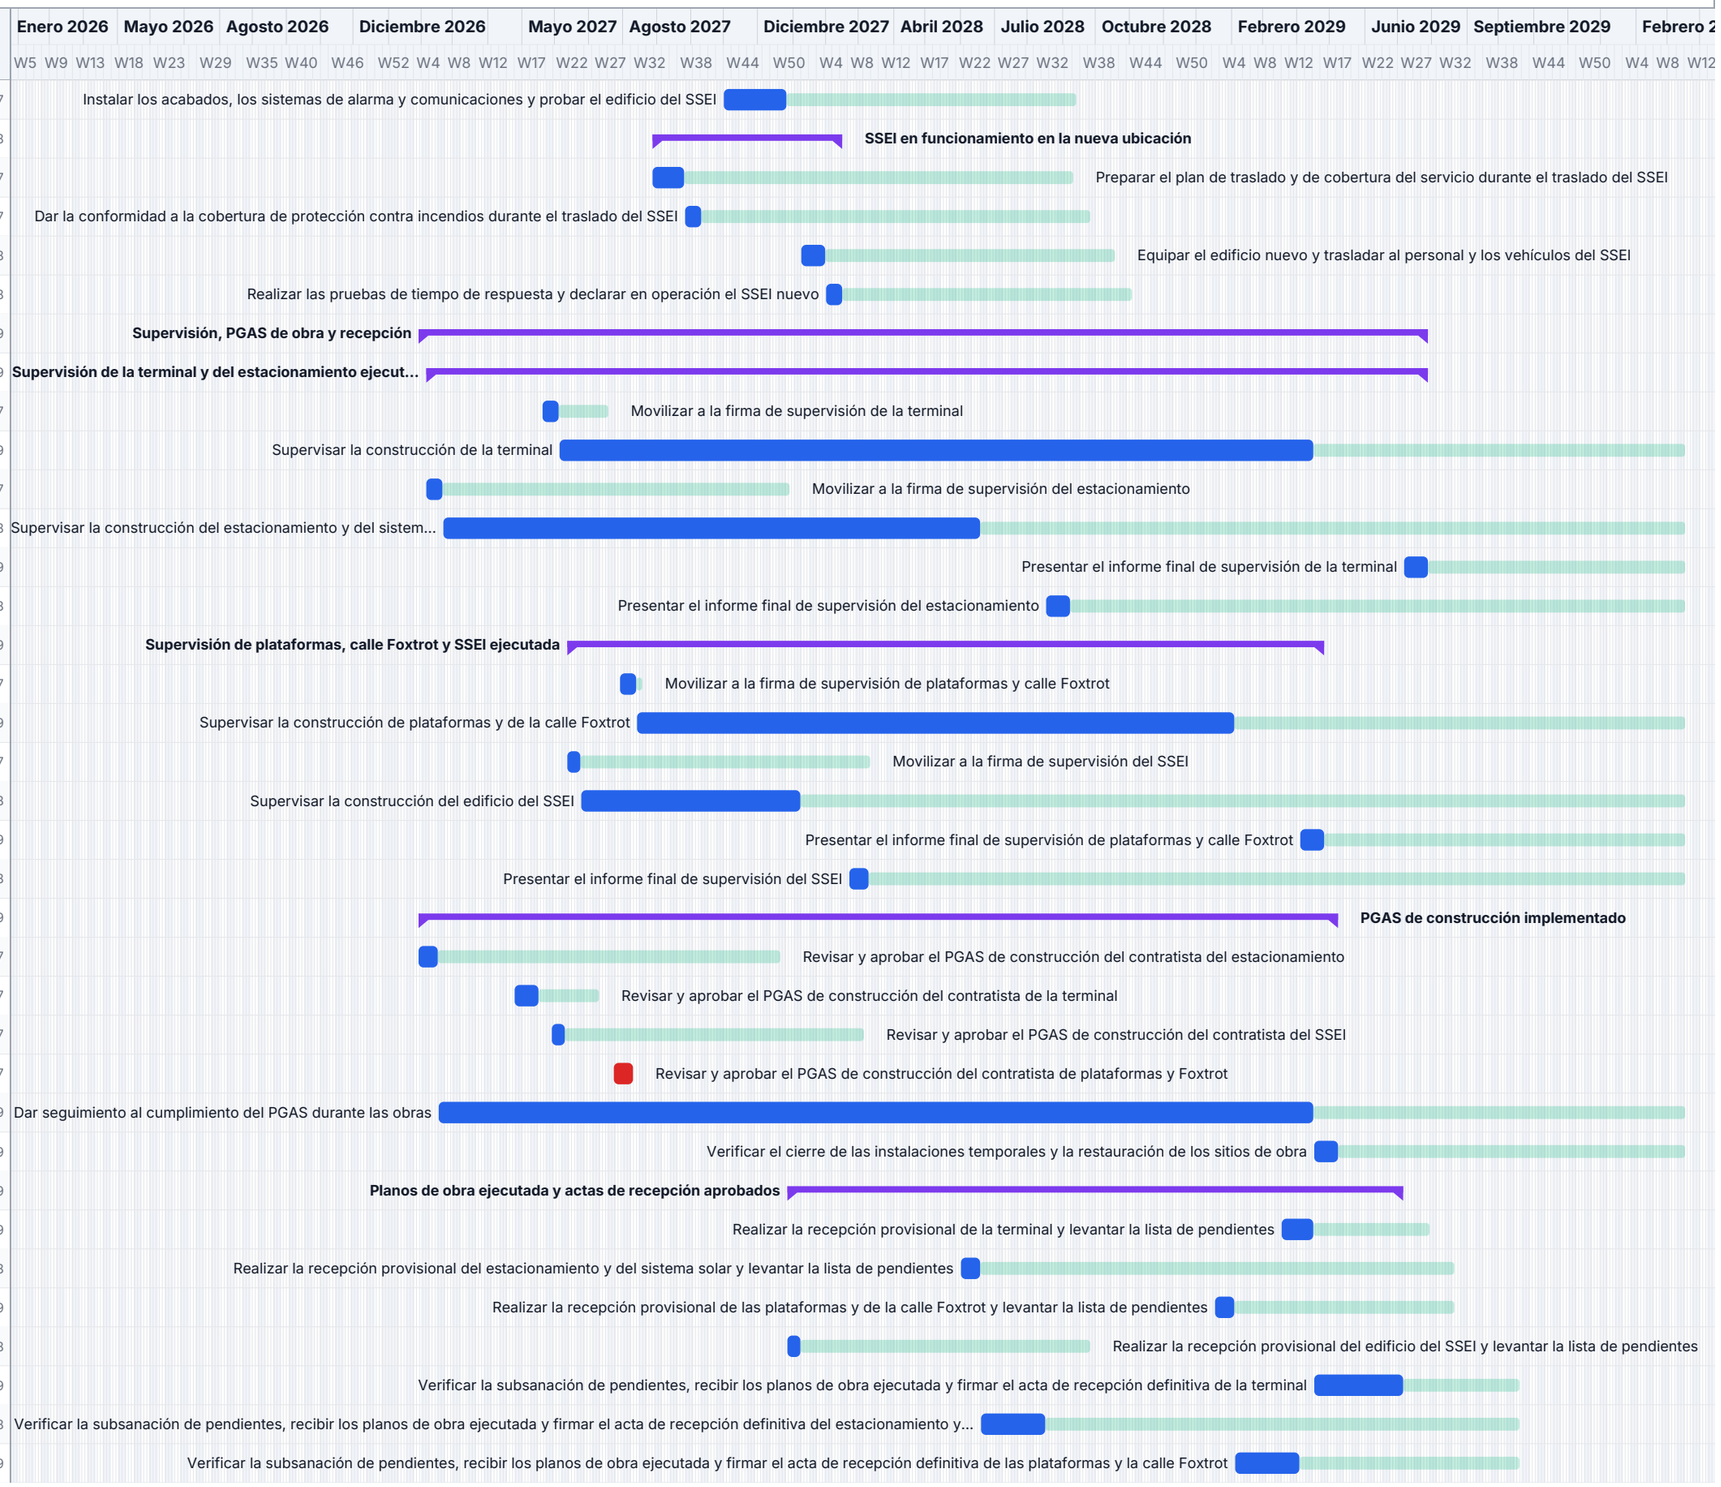

ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
1.7.4-08	Verificar la subsanación de pendientes, recibir...	31d	10-01-2028	21-02-2028
2	**Fortalecimiento institucional**	4824h	05-04-2027	25-07-2029
2.1	**Plan estratégico del sistema aeronáutico aprobado**	960h	26-05-2027	09-11-2027
2.1-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del ...	11d	26-05-2027	09-06-2027
2.1-02	Elaborar el diagnóstico del sistema aeronáutico, ...	36d	10-06-2027	29-07-2027
2.1-03	Formular la visión, los lineamientos y el plan de a...	41d	30-07-2027	24-09-2027
2.1-04	Revisar el borrador del plan estratégico y consoli...	13d	27-09-2027	13-10-2027
2.1-05	Incorporar las observaciones y entregar la versió...	11d	14-10-2027	28-10-2027
2.1-06	Aprobar el plan estratégico final y remitirlo al BID	8d	29-10-2027	09-11-2027
2.2	**Plan Maestro actualizado y funcionarios capacita...**	2528h	26-05-2027	09-08-2028
2.2.1	**Plan Maestro Aeroportuario actualizado y apro...**	2080h	26-05-2027	23-05-2028
2.2.1-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial ...	15d	26-05-2027	15-06-2027
2.2.1-02	Elaborar el inventario, el diagnóstico de instala...	77d	16-06-2027	30-09-2027
2.2.1-03	Determinar los requerimientos, evaluar alterna...	109d	01-10-2027	01-03-2028
2.2.1-04	Revisar el borrador del Plan Maestro y consoli...	27d	02-03-2028	07-04-2028
2.2.1-05	Incorporar las observaciones y las recomenda...	21d	10-04-2028	08-05-2028
2.2.1-06	Aprobar el Plan Maestro actualizado y entrega...	11d	09-05-2028	23-05-2028
2.2.2	**Funcionarios capacitados en planificación, ges...**	920h	02-03-2028	09-08-2028
2.2.2-01	Preparar el programa, los materiales y la lista ...	21d	02-03-2028	30-03-2028
2.2.2-02	Impartir los cursos de planificación, gestión y ...	42d	24-05-2028	20-07-2028
2.2.2-03	Aplicar las evaluaciones y los talleres de cierr...	7d	21-07-2028	31-07-2028
2.2.2-04	Certificar a los funcionarios aprobados y regis...	7d	01-08-2028	09-08-2028
2.3	**Estrategia y capacitación BIM**	1168h	05-04-2027	25-10-2027
2.3.1	**Estrategia BIM aprobada**	704h	05-04-2027	04-08-2027
2.3.1-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial ...	11d	05-04-2027	19-04-2027
2.3.1-02	Diagnosticar la madurez BIM de CEPA, sus pr...	21d	20-04-2027	18-05-2027
2.3.1-03	Formular la estrategia BIM (usos, roles, entorn...	30d	19-05-2027	29-06-2027
2.3.1-04	Revisar el borrador de la estrategia BIM y con...	11d	30-06-2027	14-07-2027
2.3.1-05	Incorporar las observaciones y entregar la ver...	8d	15-07-2027	26-07-2027
2.3.1-06	Aprobar la estrategia BIM final	7d	27-07-2027	04-08-2027
2.3.2	**Personal de ingeniería capacitado en BIM**	520h	27-07-2027	25-10-2027
2.3.2-01	Preparar el programa y los materiales de la ca...	15d	27-07-2027	16-08-2027
2.3.2-02	Impartir los cursos de BIM al personal de inge...	36d	17-08-2027	05-10-2027
2.3.2-03	Evaluar a los participantes en BIM	7d	06-10-2027	14-10-2027
2.3.2-04	Entregar los materiales y el registro de la capa...	7d	15-10-2027	25-10-2027
2.4	**Estudio de conectividad terrestre entregado**	1040h	26-05-2027	23-11-2027



ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

Open Planner Studio


WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
2.4-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del ...	11d	26-05-2027	09-06-2027
2.4-02	Diagnosticar el acceso terrestre al AIES con afor...	41d	10-06-2027	05-08-2027
2.4-03	Evaluar alternativas de acceso hacia San Salvad...	46d	06-08-2027	08-10-2027
2.4-04	Revisar el borrador del estudio de conectividad y...	13d	11-10-2027	27-10-2027
2.4-05	Incorporar las observaciones y entregar el inform...	11d	28-10-2027	11-11-2027
2.4-06	Aprobar el informe final del estudio de conectivid...	8d	12-11-2027	23-11-2027
2.5	**Estudio de diversificación de destinos entregado**	992h	05-04-2027	23-09-2027
2.5-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del ...	11d	05-04-2027	19-04-2027
2.5-02	Diagnosticar el mercado actual del AIES (tráfico, ...	35d	20-04-2027	07-06-2027
2.5-03	Analizar los mercados de origen y destino y las a...	46d	08-06-2027	10-08-2027
2.5-04	Revisar el borrador del estudio de diversificación...	13d	11-08-2027	27-08-2027
2.5-05	Incorporar las observaciones y entregar el inform...	11d	30-08-2027	13-09-2027
2.5-06	Aprobar el informe final del estudio de diversifica...	8d	14-09-2027	23-09-2027
2.6	**Auditoría y capacitación EDGE**	4544h	05-04-2027	06-06-2029
2.6.1	**Auditoría para la certificación EDGE realizada**	4544h	05-04-2027	06-06-2029
2.6.1-01	Registrar los proyectos de terminal y estacion...	21d	05-04-2027	03-05-2027
2.6.1-02	Realizar la auditoría de diseño y obtener el cer...	36d	04-05-2027	22-06-2027
2.6.1-03	Acompañar a CEPA y a los contratistas para c...	453d	23-06-2027	16-03-2029
2.6.1-04	Realizar la auditoría en sitio de las medidas ED...	26d	19-03-2029	23-04-2029
2.6.1-05	Atender las observaciones del proveedor de c...	26d	24-04-2029	29-05-2029
2.6.1-06	Recibir el certificado EDGE final y el informe d...	6d	30-05-2029	06-06-2029
2.6.2	**Personal capacitado en certificación EDGE**	4064h	23-06-2027	01-06-2029
2.6.2-01	Preparar el programa y los materiales de la ca...	11d	23-06-2027	07-07-2027
2.6.2-02	Impartir el curso de EDGE al personal previsto	16d	24-04-2029	15-05-2029
2.6.2-03	Evaluar y certificar a los participantes en EDGE	7d	16-05-2029	24-05-2029
2.6.2-04	Entregar el registro de la capacitación en EDGE	6d	25-05-2029	01-06-2029
2.7	**Estudio de separación de flujos entregado**	704h	05-04-2027	04-08-2027
2.7-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del ...	11d	05-04-2027	19-04-2027
2.7-02	Diagnosticar los flujos de llegadas y salidas de la...	21d	20-04-2027	18-05-2027
2.7-03	Identificar y priorizar las intervenciones de separ...	30d	19-05-2027	29-06-2027
2.7-04	Revisar el borrador del estudio de separación de ...	11d	30-06-2027	14-07-2027
2.7-05	Incorporar las observaciones y entregar el inform...	8d	15-07-2027	26-07-2027
2.7-06	Aprobar el informe final del estudio de separació...	7d	27-07-2027	04-08-2027
2.8	**Estudio de movilidad interna entregado**	824h	05-04-2027	25-08-2027
2.8-01	Elaborar el plan de trabajo y el informe inicial del ...	11d	05-04-2027	19-04-2027
2.8-02	Diagnosticar el tráfico de las vías internas con af...	30d	20-04-2027	31-05-2027



ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026
Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
2.8-03	Analizar los puntos de conflicto, definir las medid...	36d	01-06-2027	20-07-2027
2.8-04	Revisar el borrador del estudio de movilidad inter...	11d	21-07-2027	04-08-2027
2.8-05	Incorporar las observaciones y entregar el inform...	8d	05-08-2027	16-08-2027
2.8-06	Aprobar el informe final del estudio de movilidad ...	7d	17-08-2027	25-08-2027
2.9	**Programa de igualdad e inclusión ejecutado**	4824h	05-04-2027	25-07-2029
2.9-01	Elaborar el diagnóstico de necesidades, el progr...	30d	05-04-2027	14-05-2027
2.9-02	Impartir la capacitación a la primera cohorte de 1...	35d	17-05-2027	02-07-2027
2.9-03	Impartir la capacitación a la segunda cohorte de ...	35d	15-05-2028	30-06-2028
2.9-04	Impartir la capacitación a la tercera cohorte de 10...	35d	14-05-2029	29-06-2029
2.9-05	Emitir las constancias de los 300 funcionarios ap...	11d	02-07-2029	16-07-2029
2.9-06	Aprobar el informe final y registrar el indicador T...	7d	17-07-2029	25-07-2029
3	**Administración, evaluación y auditorías**	8688h	02-02-2026	01-04-2030
3.1	**Condiciones de arranque cumplidas**	496h	16-04-2026	10-07-2026
3.1.1	**Unidad ejecutora conformada y en funciones**	176h	16-04-2026	15-05-2026
3.1.1-01	Incorporar al Coordinador del Programa, al Co...	5d	16-04-2026	22-04-2026
3.1.1-02	Incorporar al Especialista de adquisiciones	5d	23-04-2026	29-04-2026
3.1.1-03	Incorporar al Especialista técnico, al Especiali...	5d	04-05-2026	08-05-2026
3.1.1-04	Registrar las firmas autorizadas del programa ...	5d	23-04-2026	29-04-2026
3.1.1-05	Documentar ante el BID la conformación de la ...	5d	11-05-2026	15-05-2026
3.1.2	**Reglamento operativo vigente**	240h	01-06-2026	10-07-2026
3.1.2-01	Ajustar el borrador del ROP acordado con el BI...	15d	01-06-2026	19-06-2026
3.1.2-02	Obtener la no objeción del BID al ROP ajustado	10d	22-06-2026	03-07-2026
3.1.2-03	Aprobar el ROP en CEPA mediante resolución ...	5d	06-07-2026	10-07-2026
3.1.3	**Convenio de transferencia de recursos vigente**	280h	18-05-2026	03-07-2026
3.1.3-01	Redactar el convenio de transferencia de recu...	20d	18-05-2026	12-06-2026
3.1.3-02	Obtener la no objeción del BID al texto del con...	5d	15-06-2026	19-06-2026
3.1.3-03	Suscribir el convenio y ponerlo en vigencia	10d	22-06-2026	03-07-2026
3.1.4	**Cuenta especial aperturada**	200h	30-04-2026	03-06-2026
3.1.4-01	Solicitar a la Dirección General de Tesorería la...	10d	30-04-2026	13-05-2026
3.1.4-02	Abrir y habilitar la cuenta especial para recibir ...	10d	14-05-2026	27-05-2026
3.1.4-03	Registrar la cuenta especial ante el BID	5d	28-05-2026	03-06-2026
3.2	**Planes de ejecución aprobados**	8024h	02-02-2026	05-12-2029
3.2.1	**Plan de ejecución plurianual aprobado**	280h	23-04-2026	10-06-2026
3.2.1-01	Actualizar la EDT, el cronograma y el presupu...	20d	23-04-2026	20-05-2026
3.2.1-02	Integrar al PEP el calendario de adquisiciones,...	10d	21-05-2026	03-06-2026
3.2.1-03	Aprobar el PEP en CEPA y presentarlo al BID	5d	04-06-2026	10-06-2026

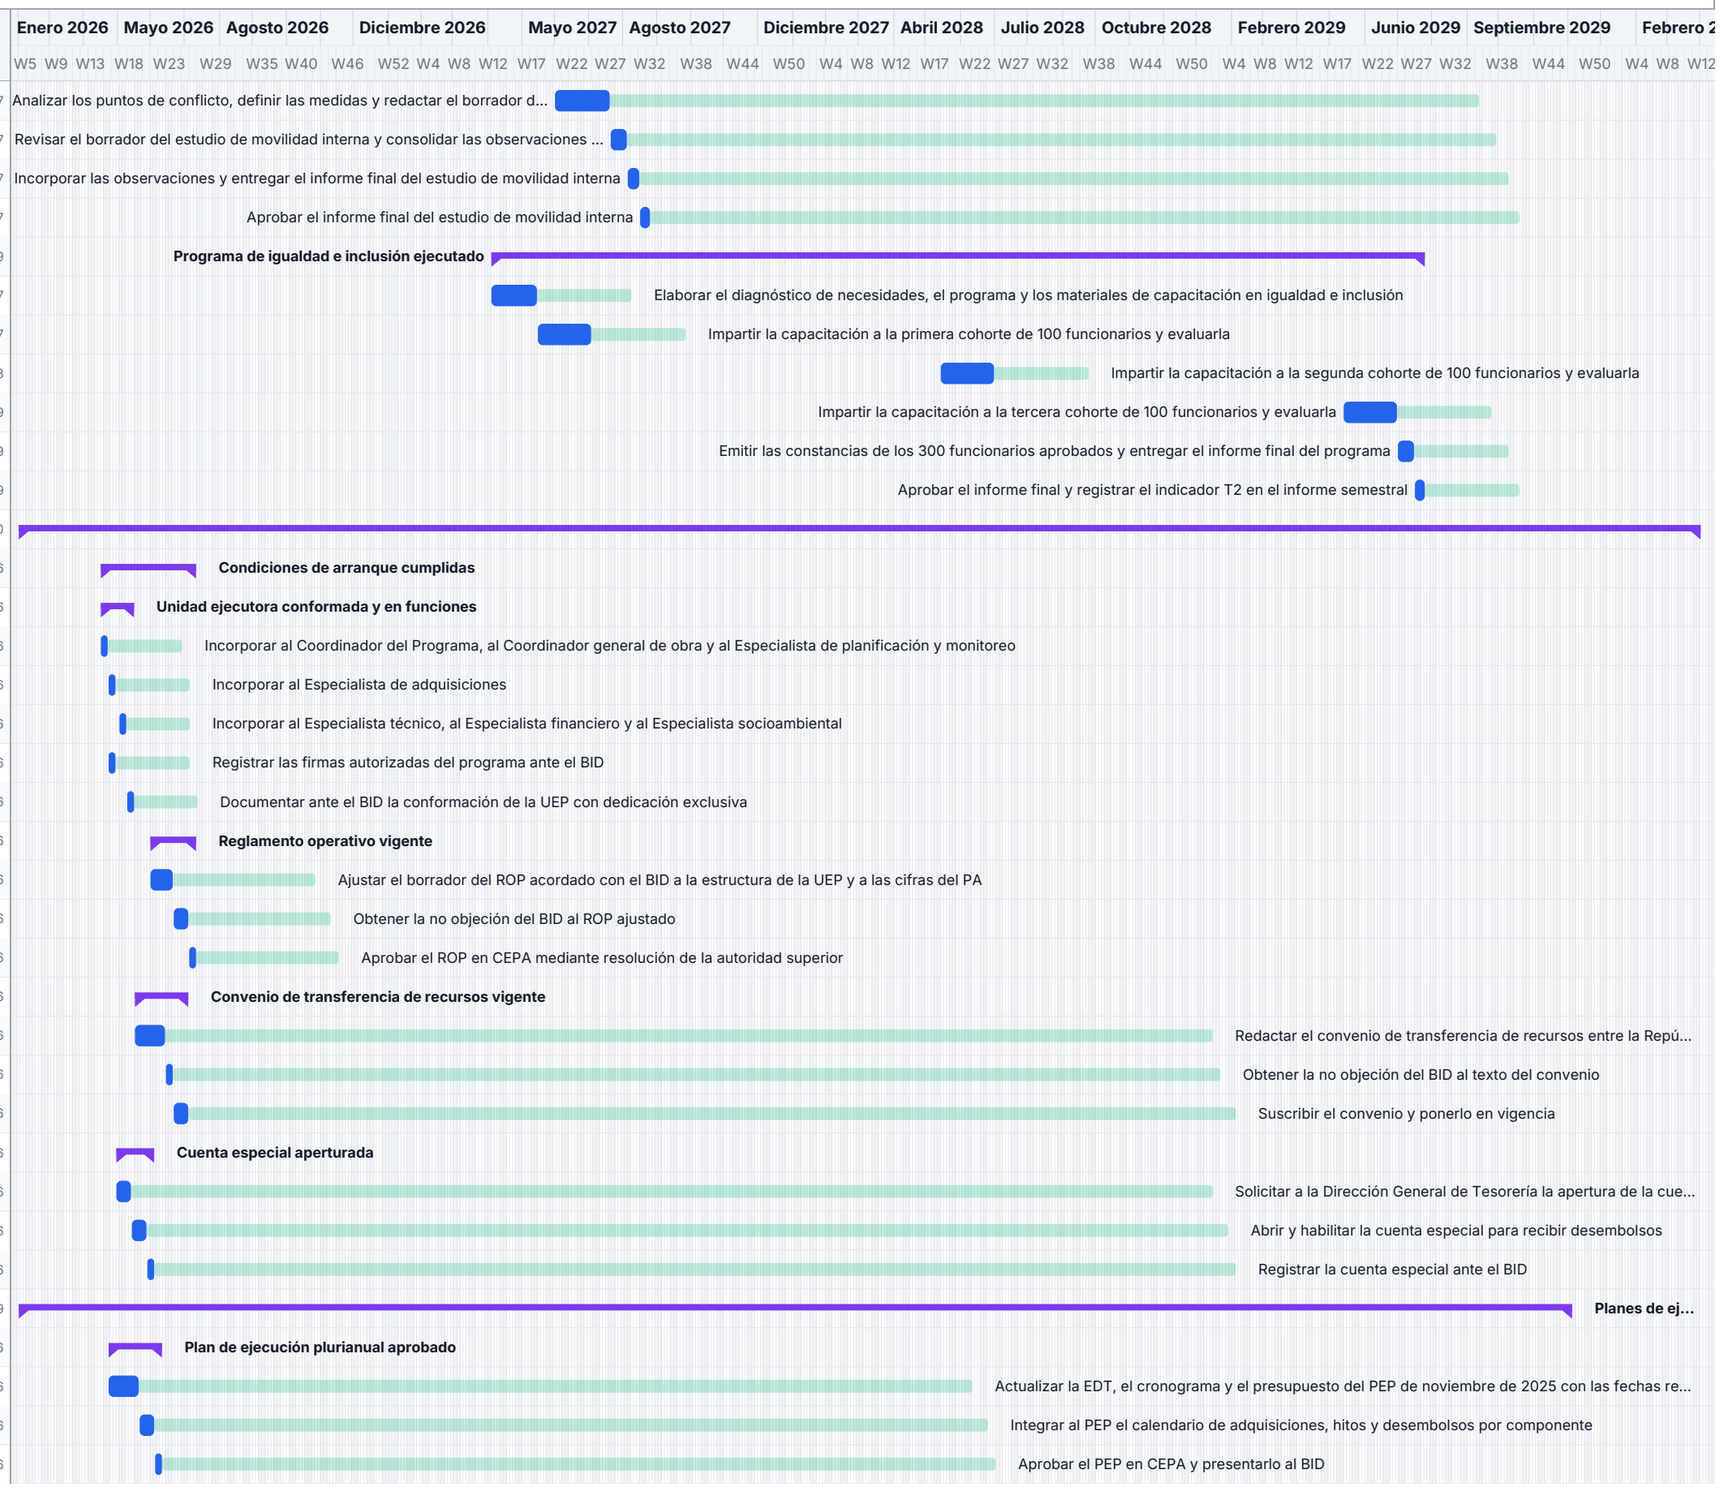


ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

Open Planner Studio


WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
3.2.2	**Planes operativos anuales aprobados**	6464h	02-11-2026	05-12-2029
3.2.2-01	Elaborar el POA 2027 con metas, cronograma ...	20d	02-11-2026	27-11-2026
3.2.2-02	Aprobar el POA 2027 en CEPA y presentarlo al...	5d	30-11-2026	04-12-2026
3.2.2-03	Elaborar el POA 2028 con metas, cronograma ...	20d	01-11-2027	26-11-2027
3.2.2-04	Aprobar el POA 2028 en CEPA y presentarlo a...	5d	29-11-2027	03-12-2027
3.2.2-05	Elaborar el POA 2029 con metas, cronograma ...	20d	01-11-2028	28-11-2028
3.2.2-06	Aprobar el POA 2029 en CEPA y presentarlo a...	5d	29-11-2028	05-12-2028
3.2.2-07	Elaborar el POA 2030 con metas, cronograma ...	20d	01-11-2029	28-11-2029
3.2.2-08	Aprobar el POA 2030 en CEPA y presentarlo a...	5d	29-11-2029	05-12-2029
3.2.3	**Plan de adquisiciones aprobado**	7264h	02-02-2026	25-07-2029
3.2.3-01	Elaborar el Plan de Adquisiciones inicial 2026-...	30d	02-02-2026	13-03-2026
3.2.3-02	Obtener la no objeción del BID al Plan de Adqu...	5d	07-04-2026	13-04-2026
3.2.3-03	Actualizar el Plan de Adquisiciones a la versió...	20d	14-04-2026	11-05-2026
3.2.3-04	Obtener la no objeción del BID al Plan de Adqu...	5d	08-07-2026	14-07-2026
3.2.3-05	Mantener el Plan de Adquisiciones actualizad...	791d	15-07-2026	25-07-2029
3.3	**Condiciones socioambientales y de seguridad ope...**	6712h	11-05-2026	26-07-2029
3.3.1	**Sistema de gestión ambiental y social y plan de ...**	1352h	11-05-2026	31-12-2026
3.3.1-01	Revisar el PAAS del 8 de octubre de 2025 y aj...	15d	11-05-2026	29-05-2026
3.3.1-02	Elaborar los procedimientos y formatos del SG...	20d	01-06-2026	26-06-2026
3.3.1-03	Obtener la no objeción del BID al SGAS y al PA...	10d	29-06-2026	10-07-2026
3.3.1-04	Incorporar el SGAS y el PAAS como anexos d...	5d	13-07-2026	17-07-2026
3.3.1-05	Elaborar el Plan de Gestión del Riesgo de Des...	31d	11-11-2026	23-12-2026
3.3.1-06	Presentar al BID el Plan de Gestión del Riesgo ...	6d	24-12-2026	31-12-2026
3.3.2	**Protocolo de seguridad operacional aprobado p...**	696h	11-11-2026	11-03-2027
3.3.2-01	Evaluar el riesgo operacional y definir las fase...	20d	11-11-2026	08-12-2026
3.3.2-02	Elaborar el protocolo de seguridad operaciona...	30d	09-12-2026	19-01-2027
3.3.2-03	Presentar el protocolo a la AAC y atender sus ...	15d	20-01-2027	09-02-2027
3.3.2-04	Aprobar el protocolo de seguridad operaciona...	22d	10-02-2027	11-03-2027
3.3.3	**Mecanismo de quejas y reclamos en operación**	5560h	20-07-2026	16-03-2029
3.3.3-01	Diseñar el procedimiento del mecanismo de q...	15d	20-07-2026	07-08-2026
3.3.3-02	Instalar y difundir los canales del mecanismo ...	20d	10-08-2026	04-09-2026
3.3.3-03	Operar el mecanismo, registrar los casos y da...	660d	07-09-2026	16-03-2029
3.3.4	**Informes de cumplimiento socioambiental pres...**	6312h	20-07-2026	26-07-2029
3.3.4-01	Acordar con el BID el formato del informe de c...	10d	20-07-2026	31-07-2026
3.3.4-02	Presentar los informes semestrales de cumpli...	544d	16-02-2027	16-03-2029
3.3.4-03	Presentar al BID el informe final ambiental y so...	15d	06-07-2029	26-07-2029

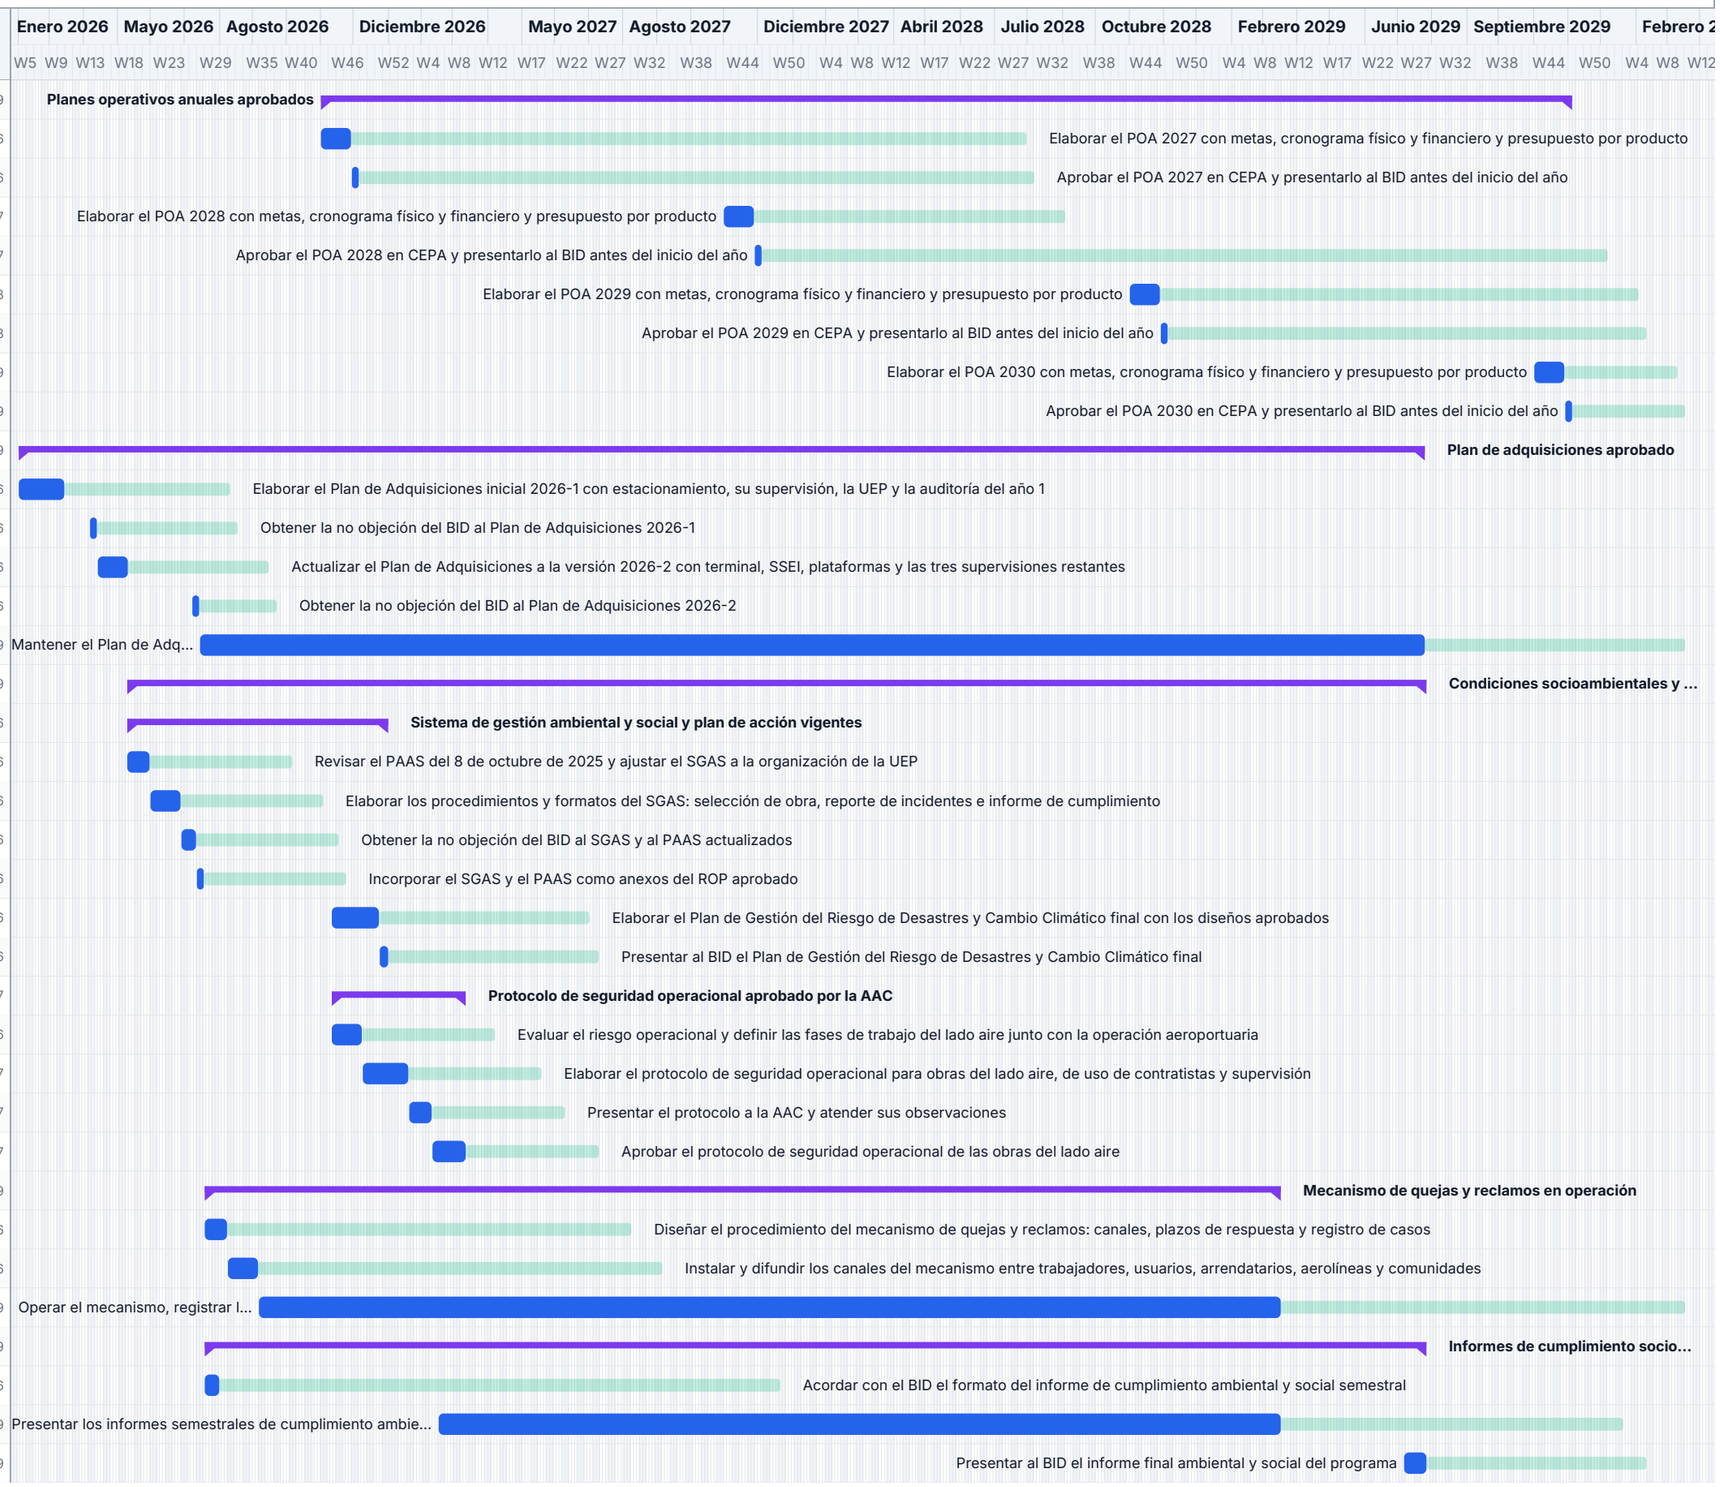

ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026
Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
3.4	**Contratos del programa firmados**	7264h	02-02-2026	25-07-2029
3.4.1	**Contratos de obras del Componente I firmados**	2264h	23-06-2026	22-07-2027
3.4.1-01	Preparar los documentos de licitación del esta...	45d	23-06-2026	24-08-2026
3.4.1-02	Obtener la no objeción del BID a los document...	5d	25-08-2026	31-08-2026
3.4.1-03	Publicar el aviso específico de adquisiciones ...	31d	04-09-2026	16-10-2026
3.4.1-04	Evaluar las ofertas del estacionamiento y el si...	29d	19-10-2026	26-11-2026
3.4.1-05	Obtener la no objeción del BID a la evaluación ...	5d	27-11-2026	03-12-2026
3.4.1-06	Adjudicar y firmar el contrato de obra del esta...	39d	04-12-2026	27-01-2027
3.4.1-07	Preparar los documentos de licitación de la ter...	45d	28-07-2026	28-09-2026
3.4.1-08	Obtener la no objeción del BID a los document...	5d	29-09-2026	05-10-2026
3.4.1-09	Publicar el aviso específico de adquisiciones ...	32d	08-10-2026	20-11-2026
3.4.1-10	Evaluar las ofertas de la terminal de pasajeros ...	44d	23-11-2026	21-01-2027
3.4.1-11	Obtener la no objeción del BID a la evaluación ...	5d	22-01-2027	28-01-2027
3.4.1-12	Adjudicar y firmar el contrato de obra de la ter...	61d	29-01-2027	23-04-2027
3.4.1-13	Preparar los documentos de licitación del SSEI	45d	05-08-2026	06-10-2026
3.4.1-14	Obtener la no objeción del BID a los document...	5d	07-10-2026	13-10-2026
3.4.1-15	Publicar el aviso específico de adquisiciones ...	31d	06-01-2027	17-02-2027
3.4.1-16	Evaluar las ofertas del SSEI y elaborar el infor...	28d	18-02-2027	29-03-2027
3.4.1-17	Obtener la no objeción del BID a la evaluación ...	5d	30-03-2027	05-04-2027
3.4.1-18	Adjudicar y firmar el contrato de obra del SSEI	38d	06-04-2027	27-05-2027
3.4.1-19	Preparar los documentos de licitación de las p...	45d	09-09-2026	10-11-2026
3.4.1-20	Obtener la no objeción del BID a los document...	5d	11-11-2026	17-11-2026
3.4.1-21	Publicar el aviso específico de adquisiciones ...	31d	12-03-2027	23-04-2027
3.4.1-22	Evaluar las ofertas de las plataformas y la call...	25d	26-04-2027	28-05-2027
3.4.1-23	Obtener la no objeción del BID a la evaluación ...	5d	31-05-2027	04-06-2027
3.4.1-24	Adjudicar y firmar el contrato de obra de las pl...	34d	07-06-2027	22-07-2027
3.4.2	**Contrato de supervisión firmado**	2568h	06-05-2026	28-07-2027
3.4.2-01	Preparar los términos de referencia, la solicitu...	17d	06-05-2026	28-05-2026
3.4.2-02	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	29-05-2026	04-06-2026
3.4.2-03	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	40d	05-06-2026	30-07-2026
3.4.2-04	Evaluar las propuestas técnicas y económicas...	124d	31-07-2026	20-01-2027
3.4.2-05	Obtener la no objeción del BID al informe de e...	5d	21-01-2027	27-01-2027
3.4.2-06	Firmar el contrato de supervisión del estacion...	5d	28-01-2027	03-02-2027
3.4.2-07	Preparar los términos de referencia, la solicitu...	49d	13-10-2026	18-12-2026
3.4.2-08	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	21-12-2026	25-12-2026
3.4.2-09	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	30d	28-12-2026	05-02-2027

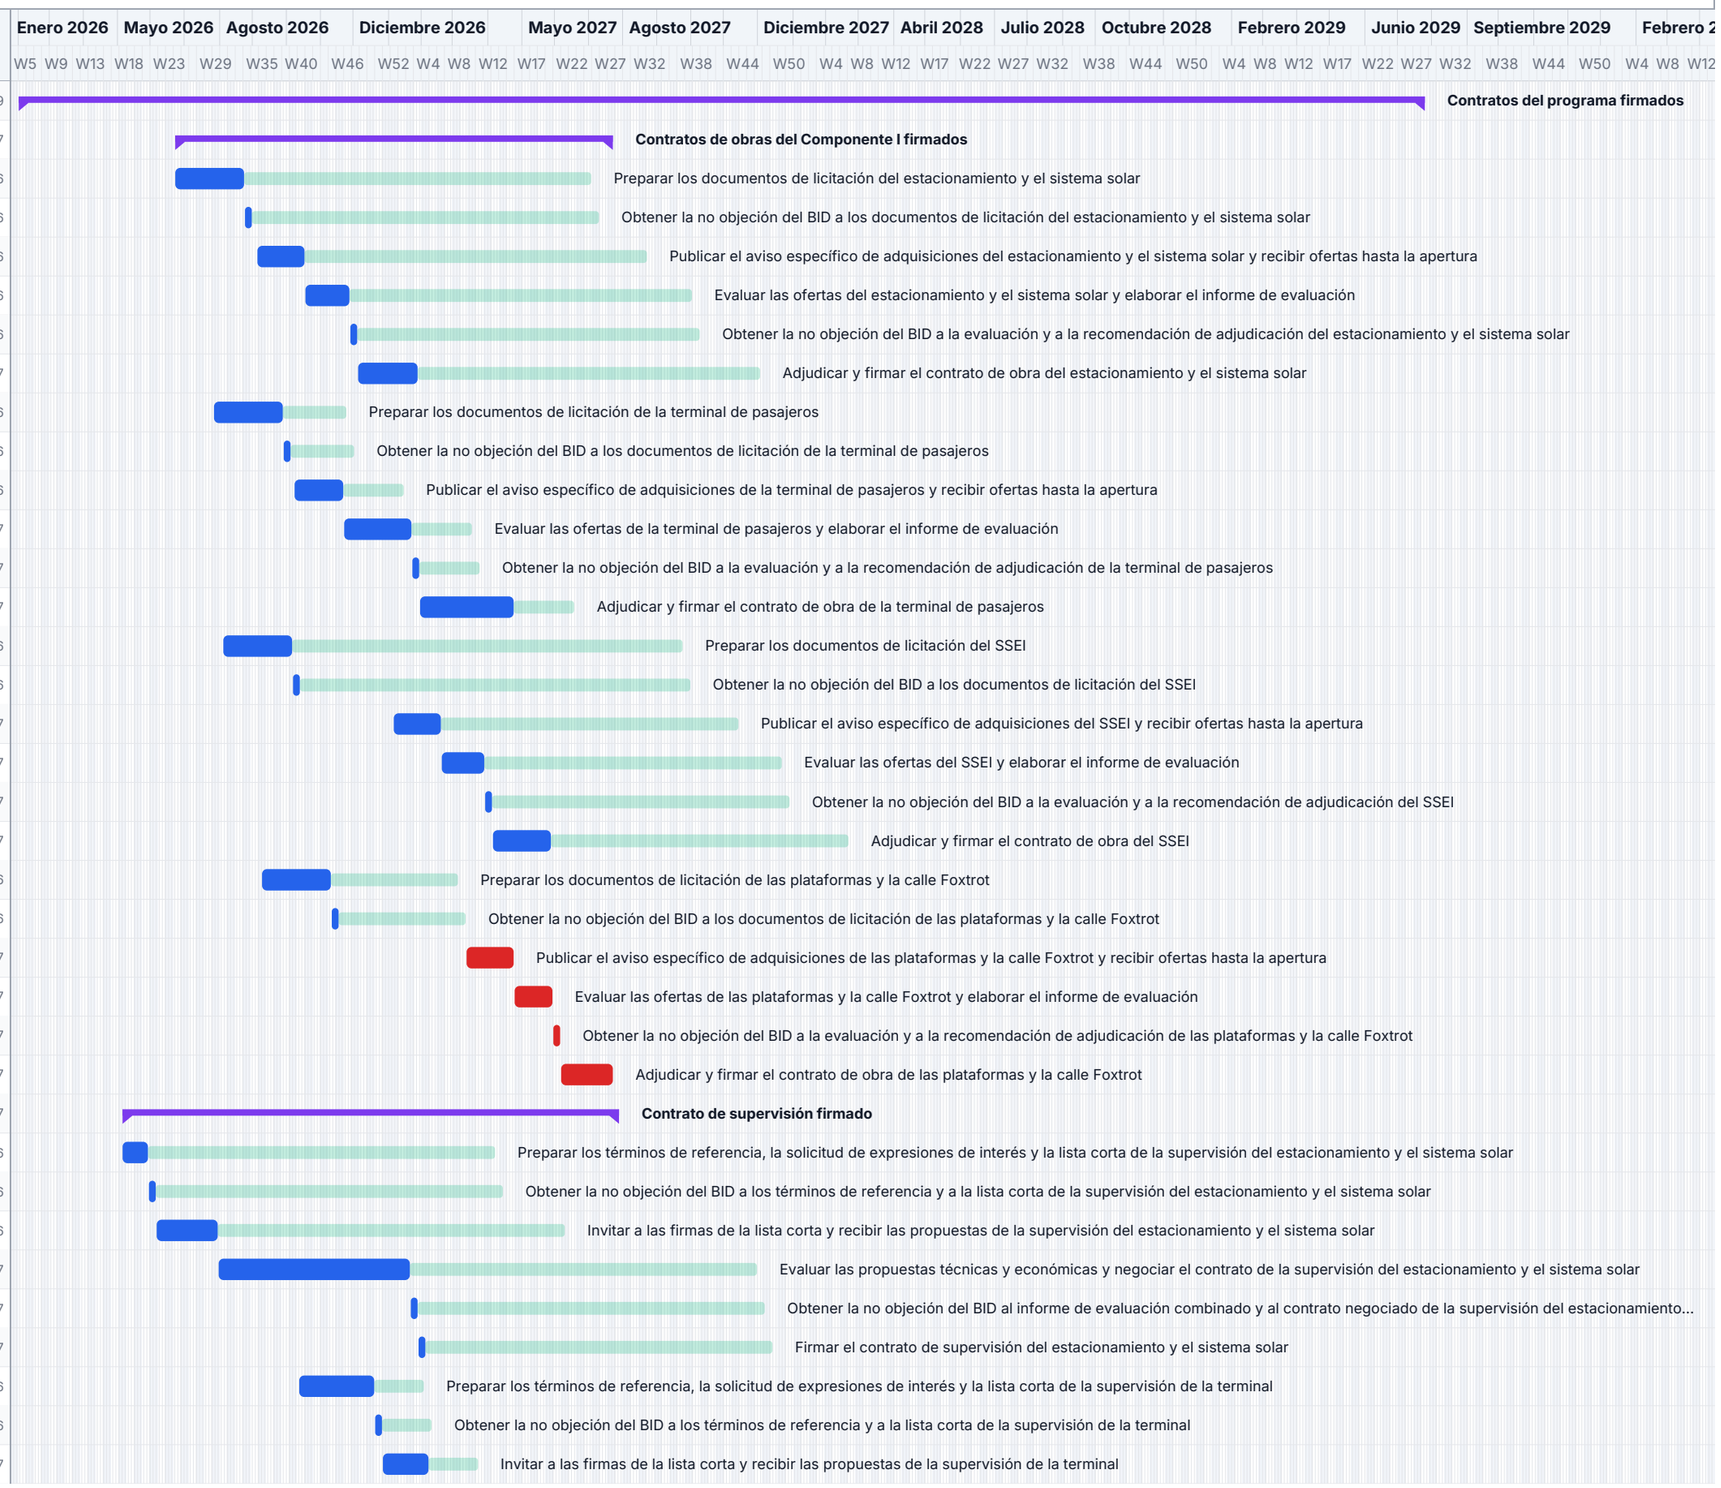

ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
3.4.2-10	Evaluar las propuestas técnicas y económicas...	60d	08-02-2027	30-04-2027
3.4.2-11	Obtener la no objeción del BID al informe de e...	5d	03-05-2027	07-05-2027
3.4.2-12	Firmar el contrato de supervisión de la terminal	8d	10-05-2027	19-05-2027
3.4.2-13	Preparar los términos de referencia, la solicitu...	47d	11-11-2026	14-01-2027
3.4.2-14	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	15-01-2027	21-01-2027
3.4.2-15	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	30d	22-01-2027	04-03-2027
3.4.2-16	Evaluar las propuestas técnicas y económicas...	57d	05-03-2027	24-05-2027
3.4.2-17	Obtener la no objeción del BID al informe de e...	5d	25-05-2027	31-05-2027
3.4.2-18	Firmar el contrato de supervisión del SSEI	8d	01-06-2027	10-06-2027
3.4.2-19	Preparar los términos de referencia, la solicitu...	40d	19-01-2027	15-03-2027
3.4.2-20	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	16-03-2027	22-03-2027
3.4.2-21	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	30d	23-03-2027	03-05-2027
3.4.2-22	Evaluar las propuestas técnicas y económicas...	49d	04-05-2027	09-07-2027
3.4.2-23	Obtener la no objeción del BID al informe de e...	5d	12-07-2027	16-07-2027
3.4.2-24	Firmar el contrato de supervisión de las plataf...	8d	19-07-2027	28-07-2027
3.4.3	**Contratos de consultorías del Componente II fir...**	1176h	02-11-2026	25-05-2027
3.4.3-01	Incluir las consultorías del Componente II en el...	15d	02-11-2026	20-11-2026
3.4.3-02	Obtener la no objeción del BID a la actualizaci...	5d	23-11-2026	27-11-2026
3.4.3-03	Preparar los términos de referencia, la solicitu...	40d	30-11-2026	22-01-2027
3.4.3-04	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	25-01-2027	29-01-2027
3.4.3-05	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	30d	01-02-2027	12-03-2027
3.4.3-06	Evaluar las propuestas y negociar el contrato ...	35d	15-03-2027	30-04-2027
3.4.3-07	Obtener la no objeción del BID al informe de e...	7d	03-05-2027	11-05-2027
3.4.3-08	Firmar el contrato de consultoría para el plan e...	10d	12-05-2027	25-05-2027
3.4.3-09	Preparar los términos de referencia, la solicitu...	40d	30-11-2026	22-01-2027
3.4.3-10	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	25-01-2027	29-01-2027
3.4.3-11	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	30d	01-02-2027	12-03-2027
3.4.3-12	Evaluar las propuestas y negociar el contrato ...	35d	15-03-2027	30-04-2027
3.4.3-13	Obtener la no objeción del BID al informe de e...	7d	03-05-2027	11-05-2027
3.4.3-14	Firmar el contrato de consultoría para la actual...	10d	12-05-2027	25-05-2027
3.4.3-15	Preparar los términos de referencia y la solicit...	20d	30-11-2026	25-12-2026
3.4.3-16	Publicar la solicitud de expresiones de interés ...	20d	28-12-2026	22-01-2027
3.4.3-17	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	20d	25-01-2027	19-02-2027
3.4.3-18	Evaluar las propuestas y negociar el contrato ...	20d	22-02-2027	19-03-2027
3.4.3-19	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría p...	10d	22-03-2027	02-04-2027
3.4.3-20	Preparar los términos de referencia, la solicitu...	40d	30-11-2026	22-01-2027



ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026
Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
3.4.3-21	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	25-01-2027	29-01-2027
3.4.3-22	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	30d	01-02-2027	12-03-2027
3.4.3-23	Evaluar las propuestas y negociar el contrato ...	35d	15-03-2027	30-04-2027
3.4.3-24	Obtener la no objeción del BID al informe de e...	7d	03-05-2027	11-05-2027
3.4.3-25	Firmar el contrato de consultoría para el estudi...	10d	12-05-2027	25-05-2027
3.4.3-26	Preparar los términos de referencia y la solicit...	20d	30-11-2026	25-12-2026
3.4.3-27	Publicar la solicitud de expresiones de interés ...	20d	28-12-2026	22-01-2027
3.4.3-28	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	20d	25-01-2027	19-02-2027
3.4.3-29	Evaluar las propuestas y negociar el contrato ...	20d	22-02-2027	19-03-2027
3.4.3-30	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría p...	10d	22-03-2027	02-04-2027
3.4.3-31	Preparar los términos de referencia y la solicit...	20d	30-11-2026	25-12-2026
3.4.3-32	Publicar la solicitud de expresiones de interés ...	20d	28-12-2026	22-01-2027
3.4.3-33	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	20d	25-01-2027	19-02-2027
3.4.3-34	Evaluar las propuestas y negociar el contrato ...	20d	22-02-2027	19-03-2027
3.4.3-35	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría p...	10d	22-03-2027	02-04-2027
3.4.3-36	Preparar los términos de referencia y la solicit...	20d	30-11-2026	25-12-2026
3.4.3-37	Publicar la solicitud de expresiones de interés ...	20d	28-12-2026	22-01-2027
3.4.3-38	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	20d	25-01-2027	19-02-2027
3.4.3-39	Evaluar las propuestas y negociar el contrato ...	20d	22-02-2027	19-03-2027
3.4.3-40	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría p...	10d	22-03-2027	02-04-2027
3.4.3-41	Preparar los términos de referencia y la solicit...	20d	30-11-2026	25-12-2026
3.4.3-42	Publicar la solicitud de expresiones de interés ...	20d	28-12-2026	22-01-2027
3.4.3-43	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	20d	25-01-2027	19-02-2027
3.4.3-44	Evaluar las propuestas y negociar el contrato ...	20d	22-02-2027	19-03-2027
3.4.3-45	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría p...	10d	22-03-2027	02-04-2027
3.4.3-46	Preparar los términos de referencia y la solicit...	20d	30-11-2026	25-12-2026
3.4.3-47	Publicar la solicitud de expresiones de interés ...	20d	28-12-2026	22-01-2027
3.4.3-48	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	20d	25-01-2027	19-02-2027
3.4.3-49	Evaluar las propuestas y negociar el contrato ...	20d	22-02-2027	19-03-2027
3.4.3-50	Adjudicar y firmar el contrato de consultoría p...	10d	22-03-2027	02-04-2027
3.4.4	**Contratos de la unidad ejecutora, evaluación y ...**	7264h	02-02-2026	25-07-2029
3.4.4-01	Preparar los términos de referencia y la convo...	18d	02-02-2026	25-02-2026
3.4.4-02	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	26-02-2026	04-03-2026
3.4.4-03	Recibir los currículos, evaluar y seleccionar a l...	20d	05-03-2026	01-04-2026
3.4.4-04	Obtener la no objeción del BID a la selección d...	5d	02-04-2026	08-04-2026
3.4.4-05	Firmar los contratos de los siete consultores cl...	5d	09-04-2026	15-04-2026




ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
3.4.4-06	Preparar los términos de referencia y la convo...	10d	15-07-2026	28-07-2026
3.4.4-07	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	29-07-2026	04-08-2026
3.4.4-08	Recibir los currículos, evaluar y seleccionar al ...	20d	05-08-2026	01-09-2026
3.4.4-09	Obtener la no objeción del BID a la selección d...	5d	02-09-2026	08-09-2026
3.4.4-10	Firmar el contrato del técnico de apoyo admini...	5d	09-09-2026	15-09-2026
3.4.4-11	Preparar los términos de referencia y la lista c...	5d	01-04-2027	07-04-2027
3.4.4-12	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	08-04-2027	14-04-2027
3.4.4-13	Invitar a las firmas, recibir y evaluar las propu...	5d	15-04-2027	21-04-2027
3.4.4-14	Obtener la no objeción del BID a la recomenda...	5d	22-04-2027	28-04-2027
3.4.4-15	Firmar el contrato de la auditoría externa año 1	5d	29-04-2027	05-05-2027
3.4.4-16	Preparar los términos de referencia y la lista c...	30d	13-09-2027	22-10-2027
3.4.4-17	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	25-10-2027	29-10-2027
3.4.4-18	Invitar a las firmas, recibir y evaluar las propu...	25d	01-11-2027	03-12-2027
3.4.4-19	Obtener la no objeción del BID a la recomenda...	5d	06-12-2027	10-12-2027
3.4.4-20	Firmar el contrato de la auditoría externa año 2	8d	13-12-2027	22-12-2027
3.4.4-21	Preparar los términos de referencia y la lista c...	30d	12-09-2028	23-10-2028
3.4.4-22	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	24-10-2028	30-10-2028
3.4.4-23	Invitar a las firmas, recibir y evaluar las propu...	25d	31-10-2028	04-12-2028
3.4.4-24	Obtener la no objeción del BID a la recomenda...	5d	05-12-2028	11-12-2028
3.4.4-25	Firmar el contrato de la auditoría externa año 3	8d	12-12-2028	21-12-2028
3.4.4-26	Preparar los términos de referencia y la lista c...	30d	16-04-2029	25-05-2029
3.4.4-27	Obtener la no objeción del BID a los términos ...	5d	28-05-2029	01-06-2029
3.4.4-28	Invitar a las firmas, recibir y evaluar las propu...	25d	04-06-2029	06-07-2029
3.4.4-29	Obtener la no objeción del BID a la recomenda...	5d	09-07-2029	13-07-2029
3.4.4-30	Firmar el contrato de la auditoría externa año 4	8d	16-07-2029	25-07-2029
3.4.4-31	Preparar los términos de referencia y la solicit...	17d	08-11-2027	30-11-2027
3.4.4-32	Publicar la solicitud de expresiones de interés ...	17d	01-12-2027	23-12-2027
3.4.4-33	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	20d	24-12-2027	20-01-2028
3.4.4-34	Evaluar las propuestas y negociar el contrato ...	33d	21-01-2028	07-03-2028
3.4.4-35	Adjudicar y firmar el contrato de la evaluación ...	10d	08-03-2028	21-03-2028
3.4.4-36	Preparar los términos de referencia y la solicit...	17d	25-12-2028	16-01-2029
3.4.4-37	Publicar la solicitud de expresiones de interés ...	17d	17-01-2029	08-02-2029
3.4.4-38	Invitar a las firmas de la lista corta y recibir las...	20d	09-02-2029	08-03-2029
3.4.4-39	Evaluar las propuestas y negociar el contrato ...	34d	09-03-2029	25-04-2029
3.4.4-40	Adjudicar y firmar el contrato de la evaluación ...	10d	26-04-2029	09-05-2029
3.5	**Control financiero, evaluación y cierre**	7728h	20-07-2026	01-04-2030

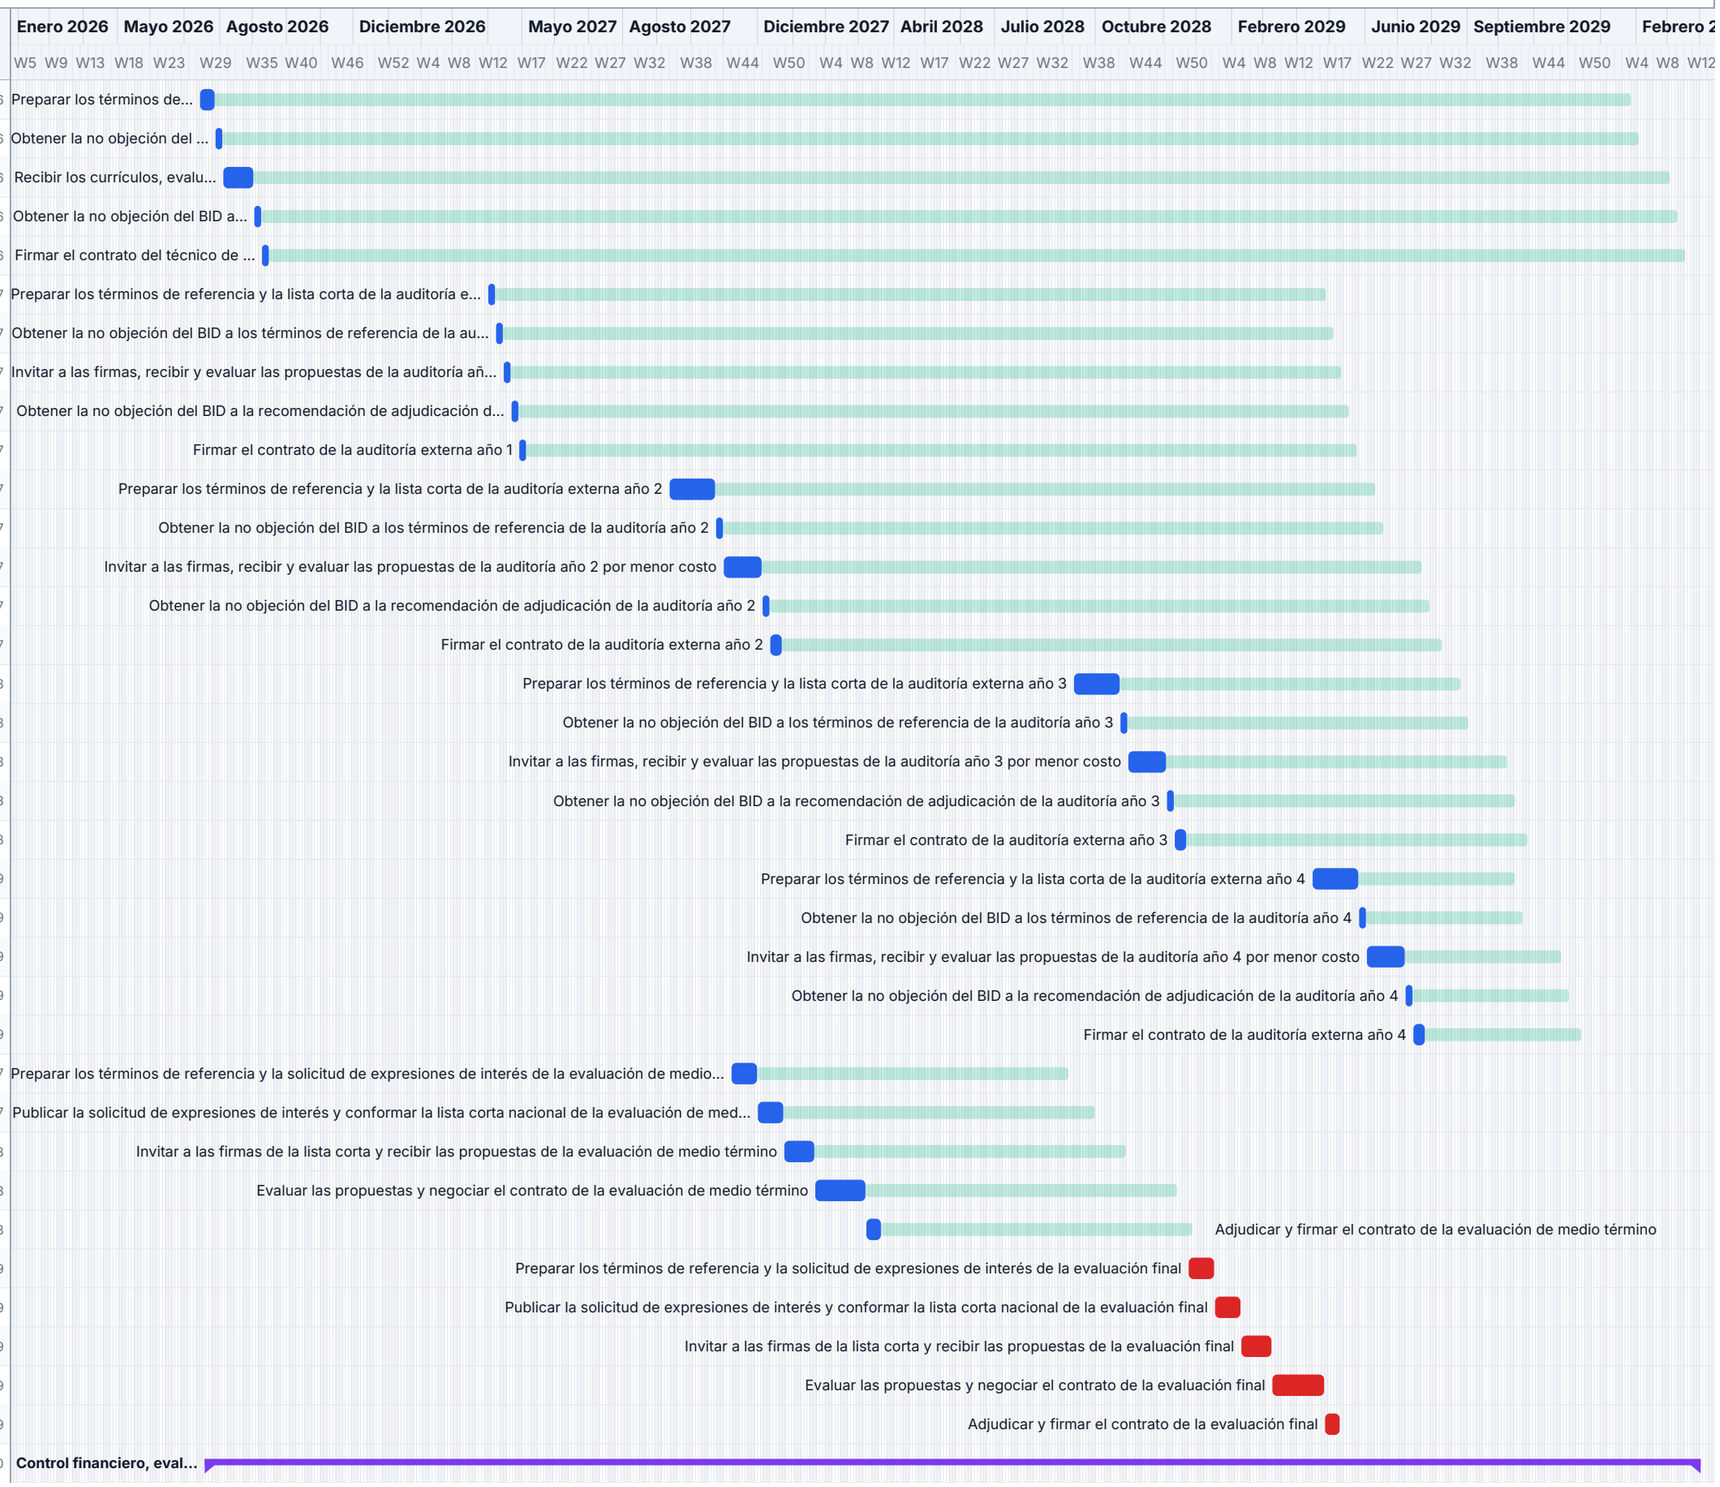


ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

Open Planner Studio

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
3.5.1	**Desembolsos justificados e informes financier...**	6464h	20-07-2026	22-08-2029
3.5.1-01	Solicitar el primer desembolso por Anticipo de...	10d	20-07-2026	31-07-2026
3.5.1-02	Elaborar y presentar al BID el informe semestr...	19d	01-01-2027	27-01-2027
3.5.1-03	Elaborar y presentar al BID el informe semestr...	19d	01-07-2027	27-07-2027
3.5.1-04	Elaborar y presentar al BID el informe semestr...	19d	03-01-2028	27-01-2028
3.5.1-05	Elaborar y presentar al BID el informe semestr...	19d	03-07-2028	27-07-2028
3.5.1-06	Elaborar y presentar al BID el informe semestr...	19d	01-01-2029	25-01-2029
3.5.1-07	Elaborar y presentar al BID el informe semestr...	19d	02-07-2029	26-07-2029
3.5.1-08	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes ...	280d	01-01-2027	27-01-2028
3.5.1-09	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes ...	279d	03-01-2028	25-01-2029
3.5.1-10	Justificar los gastos y tramitar las solicitudes ...	168d	01-01-2029	22-08-2029
3.5.2	**Auditorías externas emitidas**	4608h	01-01-2027	16-03-2029
3.5.2-01	Preparar los estados financieros del programa...	20d	01-01-2027	28-01-2027
3.5.2-02	Auditar los estados financieros del programa ...	30d	06-05-2027	16-06-2027
3.5.2-03	Presentar al BID los estados financieros audita...	5d	17-06-2027	23-06-2027
3.5.2-04	Preparar los estados financieros del programa...	20d	03-01-2028	28-01-2028
3.5.2-05	Auditar los estados financieros del programa ...	30d	31-01-2028	10-03-2028
3.5.2-06	Presentar al BID los estados financieros audita...	5d	13-03-2028	17-03-2028
3.5.2-07	Preparar los estados financieros del programa...	20d	01-01-2029	26-01-2029
3.5.2-08	Auditar los estados financieros del programa ...	30d	29-01-2029	09-03-2029
3.5.2-09	Presentar al BID los estados financieros audita...	5d	12-03-2029	16-03-2029
3.5.3	**Evaluaciones de medio término y de cierre reali...**	4272h	01-11-2027	15-11-2029
3.5.3-01	Proyectar en el POA 2028 la fecha del hito de ...	5d	01-11-2027	05-11-2027
3.5.3-02	Ejecutar la evaluación de medio término: avan...	85d	22-03-2028	18-07-2028
3.5.3-03	Revisar el informe de evaluación de medio tér...	10d	19-07-2028	01-08-2028
3.5.3-04	Ejecutar la evaluación final de efectividad sin ...	126d	10-05-2029	01-11-2029
3.5.3-05	Revisar el informe de evaluación final y prese...	10d	02-11-2029	15-11-2029
3.5.4	**Informe de terminación y cierre administrativo ...**	1424h	26-07-2029	01-04-2030
3.5.4-01	Liquidar los contratos de obra, supervisión y c...	20d	26-07-2029	22-08-2029
3.5.4-02	Justificar los anticipos pendientes y tramitar el...	20d	16-11-2029	13-12-2029
3.5.4-03	Auditar y presentar al BID los estados financie...	42d	14-12-2029	11-02-2030
3.5.4-04	Preparar y entregar al BID los insumos de la U...	25d	12-02-2030	18-03-2030
3.5.4-05	Devolver los saldos no justificados al BID y ce...	15d	12-02-2030	04-03-2030
3.5.4-06	Cerrar el expediente administrativo del progra...	10d	19-03-2030	01-04-2030
Hitos	**Hitos del programa**	8088h	15-05-2026 17:00	01-04-2030
H.1	Unidad Ejecutora conformada	0d	15-05-2026	15-05-2026

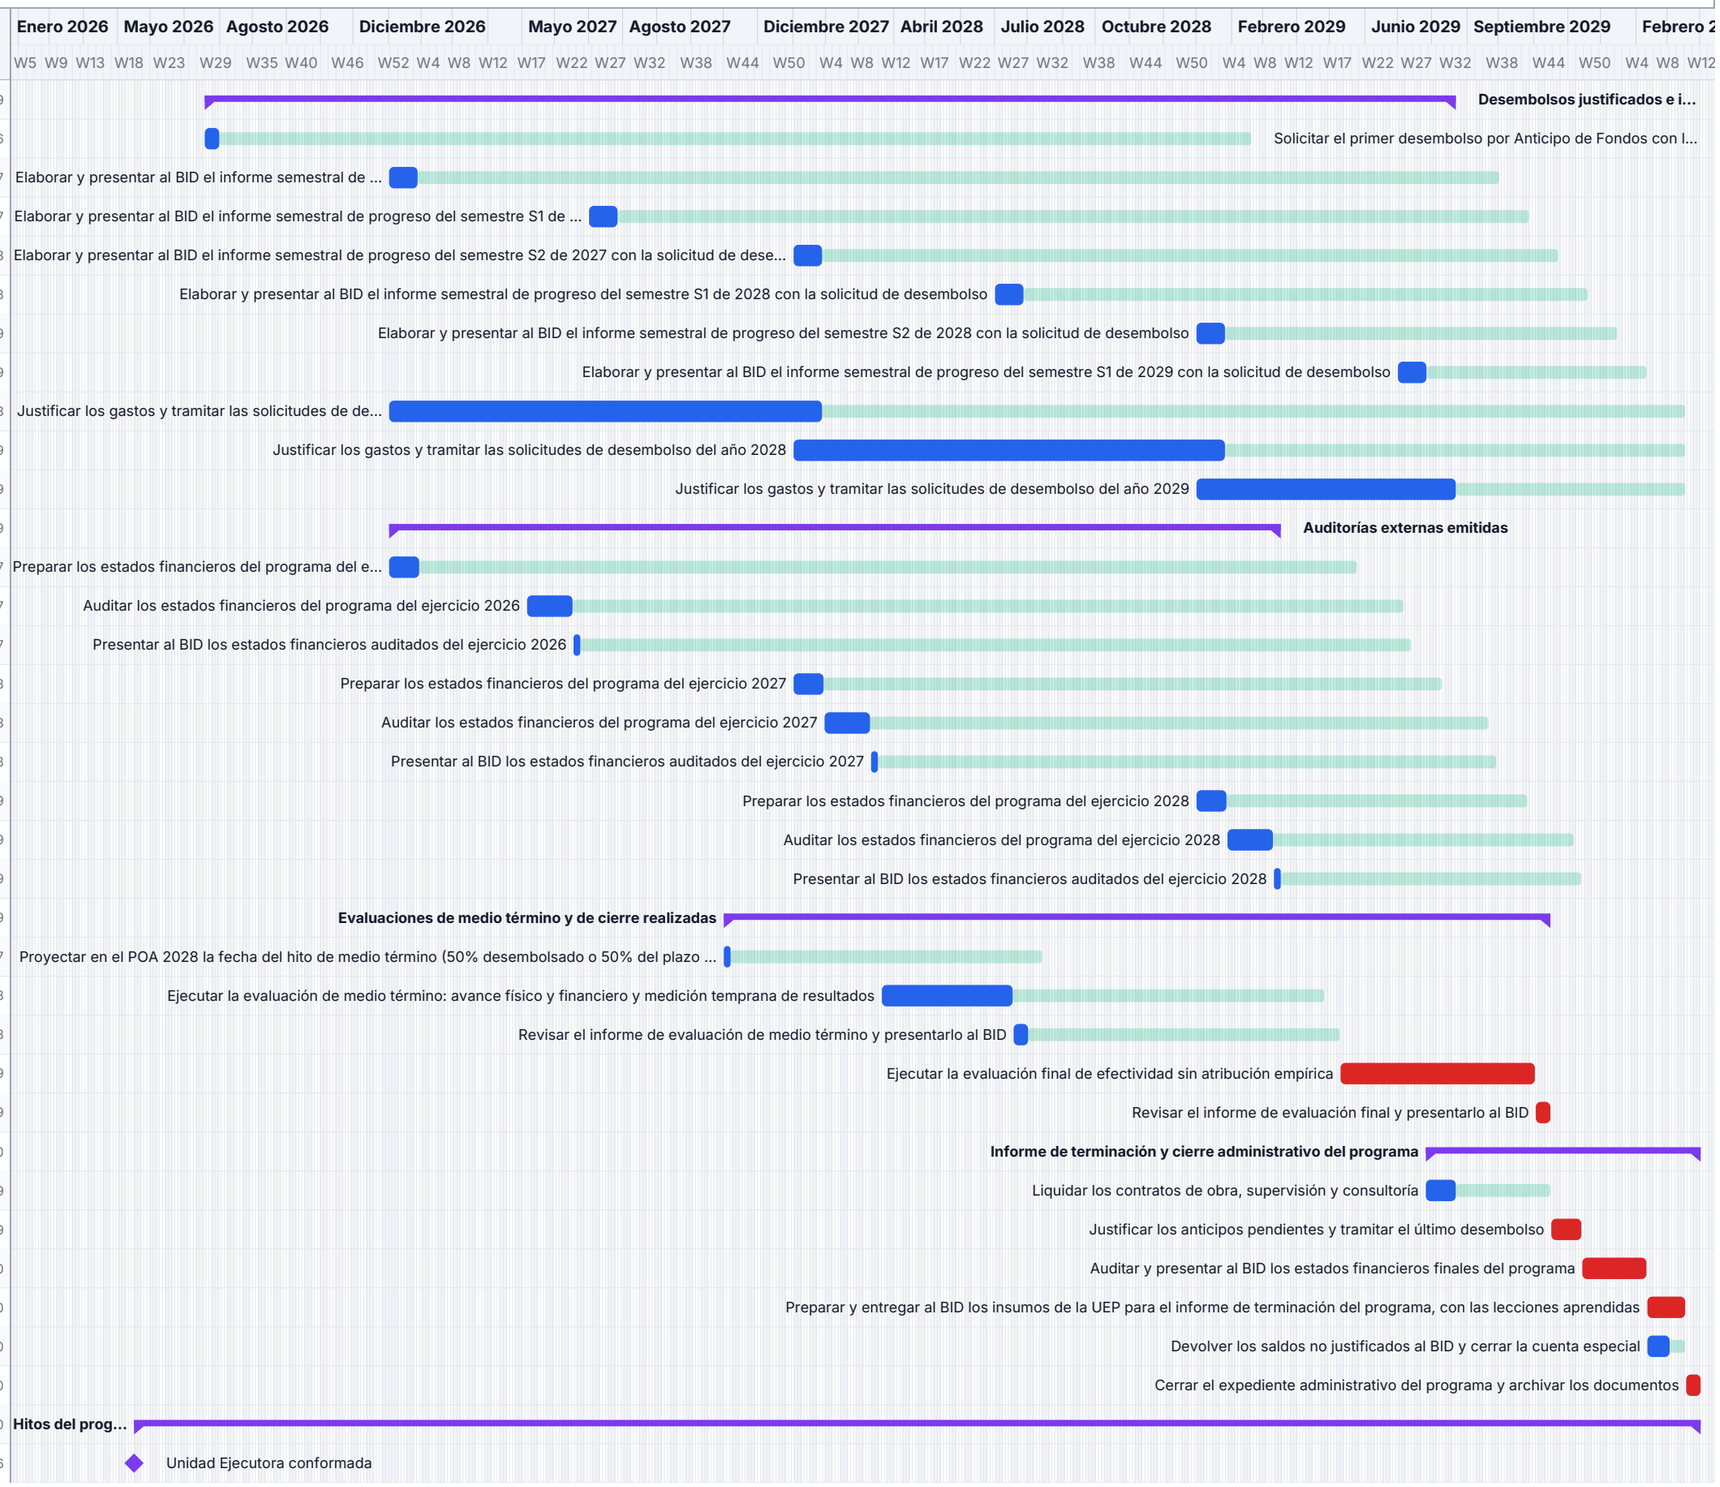

ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Ruta crítica | Normal | Hito | Resumen | Holgura

Open Planner Studio

ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026
Inicio: 02-02-2026 | Fin: 01-04-2030 | Duración: 1519d

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
H.2	Condiciones previas al primer desembolso cumplid...	0d	10-07-2026	10-07-2026
H.3	Contratos de obra y de supervisión firmados	0d	28-07-2027	28-07-2027
H.4	Protocolo de seguridad operacional aprobado por la...	0d	11-03-2027	11-03-2027
H.5	SSEI reubicado y en funcionamiento	0d	15-02-2028	15-02-2028
H.6	Plataforma de posiciones remotas concluida	0d	22-08-2028	22-08-2028
H.7	Terminal ampliada concluida y equipada	0d	16-03-2029	16-03-2029
H.8	Estacionamiento con sistema solar concluido	0d	31-05-2028	31-05-2028
H.9	Obras recibidas (planos de obra ejecutada y actas a...	0d	05-07-2029	05-07-2029
H.10	Cierre administrativo del programa	0d	01-04-2030	01-04-2030

