
ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 22-03-2030 | Duración: 1509d

Open Planner Studio

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
1	**Obras y adecuaciones**	7560h	13-04-2026	23-11-2029
1.1	**Diseños de las obras aprobados**	840h	13-04-2026	04-09-2026
1.1.1	Diseños de la terminal revisados y apr...	90d	13-04-2026	14-08-2026
1.1.2	Diseños de plataformas y calle Foxtrot ...	100d	13-04-2026	28-08-2026
1.1.3	Diseños del estacionamiento y del sist...	105d	13-04-2026	04-09-2026
1.1.4	Diseños del SSEI revisados y aprobados	70d	13-04-2026	17-07-2026
1.2	**Terminal de pasajeros ampliada**	4320h	07-06-2027	29-06-2029
1.2.1	Estructura y envolvente de la terminal ...	330d	07-06-2027	08-09-2028
1.2.2	Salas de espera, circulación y áreas d...	240d	03-01-2028	01-12-2028
1.2.3	Instalaciones eléctricas, hidráulicas, cli...	250d	17-01-2028	29-12-2028
1.2.4	Puentes de abordaje, mobiliario y equi...	130d	01-01-2029	29-06-2029
1.2.5	Accesibilidad universal, movilidad del ...	135d	22-05-2028	24-11-2028
1.3	**Plataformas de contacto y remotas**	4440h	07-06-2027	20-07-2029
1.3.1	Plataforma de posiciones de contacto ...	250d	07-06-2027	19-05-2028
1.3.2	Plataforma de posiciones remotas con...	220d	17-04-2028	16-02-2029
1.3.3	Señalización, luces y torres de ilumina...	110d	19-02-2029	20-07-2029
1.4	**Calle de rodaje Foxtrot**	2320h	07-06-2027	14-07-2028
1.4.1	Pavimento y hombros de la calle Foxtr...	220d	07-06-2027	07-04-2028
1.4.2	Señalización y balizamiento de la calle ...	70d	10-04-2028	14-07-2028
1.5	**Estacionamiento y energía solar**	3120h	07-06-2027	01-12-2028
1.5.1	Edificio de estacionamiento construido	370d	07-06-2027	03-11-2028
1.5.2	Sistemas de acceso, tráfico y áreas de...	140d	22-05-2028	01-12-2028
1.5.3	Sistema de generación solar instalado	160d	06-03-2028	13-10-2028
1.6	**SSEI reubicado y en operación**	1800h	07-06-2027	14-04-2028
1.6.1	Edificio del SSEI y vías de acceso cons...	190d	07-06-2027	25-02-2028
1.6.2	SSEI en funcionamiento en la nueva ub...	35d	28-02-2028	14-04-2028
1.7	**Supervisión, PGAS de obra y recepción**	5160h	07-06-2027	23-11-2029
1.7.1	Supervisión de la terminal y del estacio...	540d	07-06-2027	29-06-2029

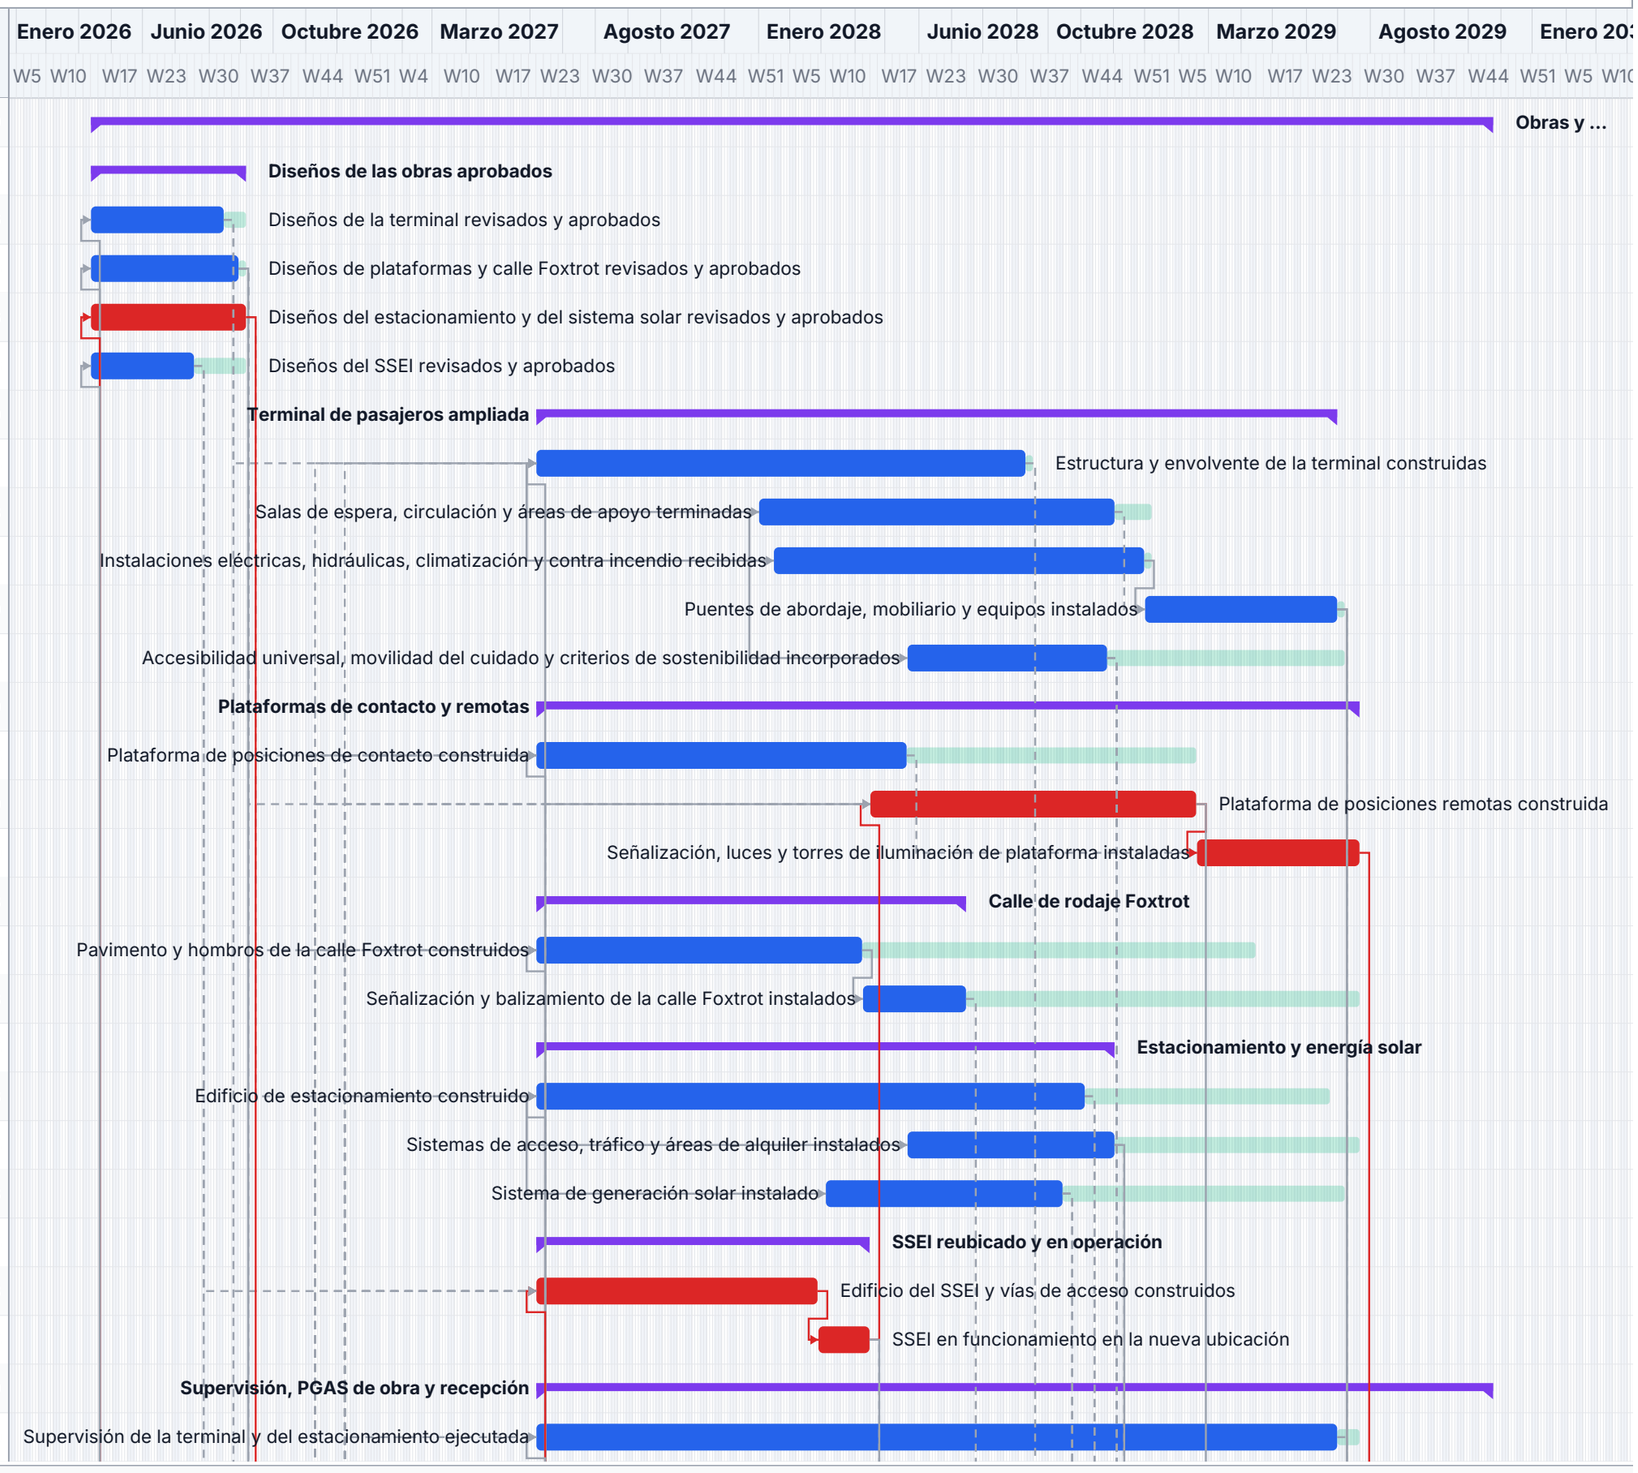

ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Ruta crítica | Normal | Hito | Resumen | Holgura | Determinante / no determinante

Open Planner Studio

ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 22-03-2030 | Duración: 1509d

Open Planner Studio

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
1.7.2	Supervisión de plataformas, calle Foxtr...	555d	07-06-2027	20-07-2029
1.7.3	PGAS de construcción implementado	555d	07-06-2027	20-07-2029
1.7.4	Planos de obra ejecutada y actas de re...	90d	23-07-2029	23-11-2029
2	**Fortalecimiento institucional**	6080h	21-12-2026	16-11-2029
2.1	Plan estratégico del sistema aeronáutico ...	150d	21-12-2026	16-07-2027
2.2	**Plan Maestro actualizado y funcionarios...**	2040h	19-07-2027	07-07-2028
2.2.1	Plan Maestro Aeroportuario actualizad...	210d	19-07-2027	05-05-2028
2.2.2	Funcionarios capacitados en planificac...	45d	08-05-2028	07-07-2028
2.3	**Estrategia y capacitación BIM**	1280h	21-12-2026	30-07-2027
2.3.1	Estrategia BIM aprobada	95d	21-12-2026	30-04-2027
2.3.2	Personal de ingeniería capacitado en B...	65d	03-05-2027	30-07-2027
2.4	Estudio de conectividad terrestre entrega...	160d	21-12-2026	30-07-2027
2.5	Estudio de diversificación de destinos ent...	160d	21-12-2026	30-07-2027
2.6	**Auditoría y capacitación EDGE**	800h	02-07-2029	16-11-2029
2.6.1	Auditoría para la certificación EDGE re...	100d	02-07-2029	16-11-2029
2.6.2	Personal capacitado en certificación E...	50d	02-07-2029	07-09-2029
2.7	Estudio de separación de flujos entregado	160d	21-12-2026	30-07-2027
2.8	Estudio de movilidad interna entregado	135d	21-12-2026	25-06-2027
2.9	Programa de igualdad e inclusión ejecuta...	150d	21-12-2026	16-07-2027
3	**Administración, evaluación y auditorías**	8640h	02-02-2026	22-03-2030
3.1	**Condiciones de arranque cumplidas**	1360h	02-02-2026	25-09-2026
3.1.1	Unidad ejecutora conformada y en fun...	50d	02-02-2026	10-04-2026
3.1.2	Reglamento operativo vigente	35d	15-06-2026	31-07-2026
3.1.3	Convenio de transferencia de recursos...	25d	03-08-2026	04-09-2026
3.1.4	Cuenta especial aperturada	15d	07-09-2026	25-09-2026
3.2	**Planes de ejecución aprobados**	7560h	13-04-2026	23-11-2029
3.2.1	Plan de ejecución plurianual aprobado	35d	13-04-2026	29-05-2026
3.2.2	Planes operativos anuales aprobados	910d	01-06-2026	23-11-2029



ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Ruta crítica | Normal | Hito | Resumen | Holgura | Determinante / no determinante

Open Planner Studio

ES-L1173 Cronograma del programa

Impreso: 31 de octubre de 2026

Inicio: 02-02-2026 | Fin: 22-03-2030 | Duración: 1509d

Open Planner Studio

WBS	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
3.2.3	Plan de adquisiciones aprobado	35d	01-06-2026	17-07-2026
3.3	**Condiciones socioambientales y de seg...**	6840h	13-04-2026	20-07-2029
3.3.1	Sistema de gestión ambiental y social ...	45d	13-04-2026	12-06-2026
3.3.2	Protocolo de seguridad operacional ap...	45d	31-08-2026	30-10-2026
3.3.3	Mecanismo de quejas y reclamos en o...	810d	15-06-2026	20-07-2029
3.3.4	Informes de cumplimiento socioambie...	555d	07-06-2027	20-07-2029
3.4	**Contratos del programa firmados**	6360h	13-04-2026	27-04-2029
3.4.1	Contratos de obras del Componente I f...	195d	07-09-2026	04-06-2027
3.4.2	Contrato de supervisión firmado	85d	03-08-2026	27-11-2026
3.4.3	Contratos de consultorías del Compon...	100d	03-08-2026	18-12-2026
3.4.4	Contratos de la unidad ejecutora, eval...	795d	13-04-2026	27-04-2029
3.5	**Control financiero, evaluación y cierre**	7280h	28-09-2026	22-03-2030
3.5.1	Desembolsos justificados e informes fi...	825d	28-09-2026	23-11-2029
3.5.2	Auditorías externas emitidas	825d	28-09-2026	23-11-2029
3.5.3	Evaluaciones de medio término y de ci...	540d	07-06-2027	29-06-2029
3.5.4	Informe de terminación y cierre admini...	85d	26-11-2029	22-03-2030
H	**Hitos del programa**	8240h	10-04-2026 17:00	22-03-2030
H.1	Unidad Ejecutora conformada	0d	10-04-2026	10-04-2026
H.2	Condiciones previas al primer desembols...	0d	25-09-2026	25-09-2026
H.3	Contratos de obra y de supervisión firma...	0d	04-06-2027	04-06-2027
H.4	Protocolo de seguridad operacional apro...	0d	30-10-2026	30-10-2026
H.5	SSEI reubicado y en funcionamiento	0d	14-04-2028	14-04-2028
H.6	Plataforma de posiciones remotas conclui...	0d	16-02-2029	16-02-2029
H.7	Terminal ampliada concluida y equipada	0d	29-06-2029	29-06-2029
H.8	Estacionamiento con sistema solar concl...	0d	01-12-2028	01-12-2028
H.9	Obras recibidas (planos de obra ejecutad...	0d	23-11-2029	23-11-2029
H.10	Cierre administrativo del programa	0d	22-03-2030	22-03-2030

